

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA IZARTU II

AÑO 2009



Julio 2010

Índice

1. INTRODUCCION	1
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES	3
3. MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IZARTU 2004-2009	6
3.1. EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DURANTE EL 2009 Y DESVIACIONES	6
3.1.1. Ejecución financiera de la intervención durante el 2009	8
3.1.2. Modificaciones y desviaciones respecto a la programación	11
3.2. VALORACIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA BAJO LAS PERSPECTIVAS FUNCIONAL Y TERRITORIAL	14
3.2.1. Avance del Programa atendiendo a la inversión	14
3.2.2. El esfuerzo inversor local y subvenciones percibidas	17
3.2.3. Valoración del avance desde una visión integral por los Ayuntamientos	18
3.2.4. Gestión y difusión del Programa	22
4. MEMORIA DE AVANCE EN LOS PROCESOS DE REVITALIZACIÓN URBANA	24
4.1. AVANCE EN LOS OBJETIVOS: INVERSIÓN Y REALIZACIONES	24
4.2. RESULTADOS E IMPACTOS EN LOS PROCESOS DE REVITALIZACIÓN URBANA	29
4.2.1. Integración territorial	29
4.2.2. Recuperación y mejora de espacios deteriorados y/o abandonados	31
4.2.3. Reducción del impacto ambiental de las actividades urbanas	34
4.2.4. Apoyo al empresariado, PYMEs, turismo y patrimonio municipal	35
4.2.5. Introducir Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	37
4.2.6. Servicios y equipamientos socio-culturales y asistenciales	39

Índice de gráficos

3. MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IZARTU 2004-2008

Gráfico 1: Ejecución media de los Programas Izartu 2004-2009.....	8
Gráfico 2: Ámbitos de intervención. Gasto efectuado en 2009 por los Programas Izartu II respecto a la programación para dicho año.	9
Gráfico 3: Comarcas. Gasto efectuado en 2009 por los Programas Izartu II respecto a la programación para dicho año... ..	10
Gráfico 4: Municipios. Desviaciones respecto a la programación de 2009 de los Programas Izartu II.....	12
Gráfico 5: Actuaciones. Desviaciones respecto a la programación de 2009 de los Programas Izartu II.....	13
Gráfico 6: Avance de Programas en el periodo 2004-2009 respecto a la inversión total.....	14
Gráfico 7: Ámbitos de Intervención. Gasto acumulado en el periodo 2004-2009 por los Programas Izartu II a la inversión total.....	15
Gráfico 8: Comarcas. Gasto acumulado en el periodo 2004-2009 por los Programas Izartu II respecto a la inversión total.....	16
Gráfico 9: Valoración de la satisfacción con la marcha del Programa Izartu II.....	19
Gráfico 10: Gasto en asistencia técnica al programa Izartu II en el periodo 2004-2009	22
Gráfico 11: Herramientas de comunicación, información y difusión utilizadas en el año 2009	23

4. MEMORIA DE AVANCE EN LOS PROCESOS DE REVITALIZACIÓN URBANA

Gráfico 12: Objetivos generales de cohesión. Gasto efectuado en el periodo 2004-2009 respecto a la inversión total.	26
Gráfico 13: Contribución de los Programas Izartu II a la "Integración territorial".	30
Gráfico 14: Contribución de los Programas Izartu II a "Recuperación y mejora de espacios".	32
Gráfico 15: Contribución de los Programas Izartu II a "Reducción del impacto ambiental".	34
Gráfico 16: Contribución de los Programas Izartu II a "Empresariado, Pymes y turismo".	36
Gráfico 17: Contribución de los Programas Izartu II a "Introducción NTICs".	38
Gráfico 18: Contribución de los Programas Izartu II a "Discriminación positiva".	40

Índice de tablas

Tabla 1: Análisis de las actuaciones presentadas en los Programas Izartu II en función de los ámbitos de intervención. Año 2009.	7
Tabla 2: Programas Izartu II atendiendo al año de finalización (real o previsto).....	11
Tabla 3: Municipios que han modificado su programación a lo largo de año 2009	12
Tabla 4: Municipios con desviaciones de ejecución en la inversión subvencionable.	13
Tabla 5: Ayudas y financiación municipal en la inversión ejecutada 2004-2009 por los Programas Izartu II.....	18
Tabla 6: Análisis de las actuaciones terminadas en los Programas Izartu en función de los ámbitos de intervención. Año 2009.	20
Tabla 8: Aspectos más valorados de las actuaciones finalizadas en los Programas Izartu II	21
Tabla 9: Objetivos generales de cohesión. Avance en las realizaciones en el periodo 2004-2009	28

1. Introducción

El Informe de Seguimiento y Evaluación del Programa Izartu, Año 2009, presenta la síntesis del desarrollo de los 68 Programas integrales de revitalización urbana apoyados por la convocatoria del Programa Izartu II y de los resultados e impactos más destacables en el avance a la vertebración territorial, social y económica en los municipios beneficiarios.

El informe que se presenta a continuación trata de recoger y detallar la ejecución durante el ejercicio de referencia así como aportar una visión global del esfuerzo realizado en estos años, el avance acumulado en la recta final del Programa, resultados y efectos obtenidos, basando su información en los datos aportados por los propios responsables locales de los Programas en los Informes Anuales de Ejecución de 2009.

Así, como en anteriores informes, además del resumen ejecutivo, el Informe de Seguimiento Año 2009, consta de dos capítulos centrales.

El primer capítulo, Memoria de Ejecución del Programa Izartu 2004-2009, constituye un análisis técnico sobre cómo se desarrollan las previsiones respecto al avance real de los Programas, la ejecución de la intervención y la evolución en definitiva de esta iniciativa atendiendo a la **clasificación funcional-** Ejes y Medidas- **y territorial-** Comarcas y Municipios-.

Los aspectos que se describirán en dicho capítulo se corresponderán con la ejecución financiera de la intervención, las modificaciones o desviaciones respecto a su programación, causas y soluciones adoptadas, el estado de avance de los ejes prioritarios y de los municipios, la recepción de otras subvenciones, la utilización de la asistencia técnica y las medidas adoptadas para garantizar la difusión del Programa.

El segundo capítulo, Memoria de avance en los procesos de revitalización urbana, analiza la contribución de los Programas a la realidad que pretenden transformar, es decir, se trata de una valoración cualitativa sobre la consecución de los objetivos generales de cohesión que persigue el Programa y al que se han acogido los 68 ayuntamientos beneficiarios de esta segunda convocatoria.

En sus apartados se describirán el avance en sus realizaciones previstas, los resultados obtenidos y su impacto sobre el incremento de la cohesión territorial, social y económica en sus áreas de influencia.

2. Resumen y conclusiones

En el año 2009 culminan la ejecución de sus Programas otros 12 municipios beneficiarios, lo que sumado a los 29 que terminaron en años anteriores, revela que un 60% de los Programas Izartu han finalizado. Por otro lado, 27 municipios se han acogido a la posibilidad de prorrogar la ejecución hasta 2010, encontrándose a un año de finalización de la iniciativa.

La intensificación en el ritmo de ejecución alcanzado en los dos últimos años, 2008 y 2009, indica que al finalizar el ejercicio 2010 (último año) las actuaciones subvencionadas quedarán debidamente concluidas y el impacto esperado por el Programa pasará a ser una realidad dentro del plazo estimado.

Así, **en el año 2009 los municipios beneficiarios del Programa Izartu II han ejecutado algo más del 90% del total de la inversión prevista para el conjunto de la iniciativa**. El esfuerzo económico realizado durante el año 2009, al que se añade el esfuerzo realizado en ejercicios precedentes, ha posibilitado una inversión acumulada de cerca de 155,9 millones de euros respecto al presupuesto total de 172.933.904 €. A dicha inversión se suma el hecho de que **el 82% de las actuaciones subvencionadas bajo esta segunda convocatoria del Programa Izartu han finalizado**, la mayoría de las cuales se encuentran enmarcadas dentro del ámbito de intervención de infraestructuras de ordenación y rehabilitación.

La buena marcha de los Programas se constata a su vez en el grado de cumplimiento de las previsiones de ejecución del gasto para 2009, **adecuándose en más de un 90% a la programación en el año de referencia**. En este sentido, Álava con dos municipios beneficiarios, *Salvatierra-Agurain* y *Vitoria-Gasteiz*, ha finalizado el Programa Izartu, Gipuzkoa ha ejecutado el 96% de la inversión total prevista y Bizkaia el 84%. Atendiendo a las comarcas han finalizado sus Programas *Arratia Nervión*, *Bilbao*, *Donostia- San Sebastián*, *Llanada Alavesa*, *Markina-Ondarroa* y *Plentzia-Mungia*.

A estas alturas del Programa prácticamente han quedado descartadas aquellas actuaciones cuya ejecución era inviable, concentrándose los esfuerzos en el resto. Por otra parte, aún persisten retrasos en algunos Programas (*Bermeo, Leioa, Sestao, Trucios y Valle de Trápaga*) que cobran especial importancia a un año de la finalización, si bien, bajo el punto de vista de sus responsables locales se ejecutarán dentro de los plazos previstos.

Con todo ello, **los resultados de los procesos de rehabilitación urbana emprendidos están siendo notorios** y satisfactorios para los habitantes que residen en los municipios beneficiarios. Tanto desde el ámbito institucional como desde la opinión ciudadana la valoración sobre los Programas finalizados es muy positiva ya que **los resultados son excelentes en cuanto al impacto social obtenido incidiendo en la regeneración de los núcleos urbanos que por falta de recursos estaban sufriendo procesos degenerativos**. Como en años anteriores, se destaca especialmente los nuevos equipamientos, servicios y mejoras respecto al medioambiente y la calidad de vida y como aspectos transversales, la participación ciudadana, la colaboración institucional, la integralidad del Programa y su efecto tractor o motor de revitalización económica, social y urbanística.

Atendiendo específicamente a los objetivos generales del Programa Izartu, se ha mejorado la accesibilidad, superando barreras físicas y tejiendo una trama urbana cohesionada con actuaciones dirigidas a *Solucionar problemas de integración territorial* (73.000 m² de viales nuevos o mejorados, 41 km de pasarelas, aceras y paseos renovados y nuevas equipamientos para la accesibilidad: 8 rampas y 10 escaleras mecánicas, 2 ascensores,..). Se ha regenerado una superficie aproximada de 770.000 m², de los cuales 500.000 m² corresponden a espacio urbano rehabilitado y 30.000 m² a entornos naturales y se han renovado más de 95.000 m lineales de canalizaciones para servicios y suministros bajo los objetivos de *Recuperación y mejora de espacios y Reducción del impacto ambiental de las actividades urbanas*.

En el transcurso de estos 6 años y en el objetivo de *Introducción de las NTICs* se han desarrollado actuaciones específicas para impulsar el uso de la informática y Nuevas Tecnologías con la instalación de redes de fibra óptica y desarrollo de iniciativas de administración digital. En cuanto a equipamientos y servicios bajo los objetivos de *Apoyo al empresariado, PYMEs, turismo y patrimonio municipal* y *Discriminación positiva a favor de colectivos amenazados de exclusión* se ha conseguido 150.230 m2 de superficie dedicada a la actividad económica y 22.300 m2 de superficie dedicada a infraestructuras socio-culturales, desarrollándose a su vez más de 200 iniciativas que favorecen de manera directa al tejido empresarial y mas de 400 actividades socio-culturales para el desarrollo humano y social de los habitantes de los municipios beneficiarios.

3. Memoria de ejecución del Programa Izartu 2004-2010

3.1

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DURANTE EL 2009 Y DESVIACIONES

En este capítulo se aborda el desarrollo de la ejecución de los Programas Izartu II y el grado de avance de los mismos a lo largo del año 2009 en la consecución de los objetivos asignados a cada uno de los ámbitos de intervención y por cada uno de los territorios beneficiarios del Programa.

Se trata por consiguiente de un análisis técnico atendiendo a la clasificación funcional- Ejes y Medidas- y territorial- Comarcas y Municipios- sobre cómo se han desarrollado las previsiones de la planificación del ejercicio de referencia en los 39 Programas Izartu (en el periodo 2004-2008 ya habían finalizado 29), la ejecución de la intervención y la evolución en definitiva de esta iniciativa.

La clasificación funcional se centra en una agrupación homogénea de las actuaciones presentadas por los distintos Programas Izartu en ámbitos de intervención, generales- EJES- y específicos- MEDIDAS-, para favorecer el seguimiento y análisis de la aplicación global de las ayudas. Los ámbitos de intervención de los Programas Izartu 2004-2010 se constituyen en cuatro ejes - Entorno Productivo, Infraestructuras Básicas Locales, Integración Social y Servicios Locales y Asistencia Técnica- y 20 medidas.

En esta clasificación se encuentran repartidas 320 actuaciones, una menos que en 2008 tras la eliminación de dos actuaciones e incorporación de una nueva. Desde el inicio del Programa Izartu y en un cómputo global no se registran grandes diferencias con relación a las modificaciones a la programación inicial y el total de actuaciones se ha visto reducido sólo en 16 actuaciones desde 2004.

Del mismo modo, las modificaciones registradas en el periodo 2009 no suponen cambios significativos respecto a la distribución de las actuaciones, ya que al igual que en sus inicios, el mayor número de actuaciones y de inversión se sitúa en el EJE 2 Infraestructuras Básicas Locales. **La concentración de actuaciones en este EJE en el año 2009 representa el 96% de la inversión total del programa y el 77% del total de las actuaciones desarrolladas.** El EJE 1 "Entorno productivo" y el EJE 3 "Integración Social y Servicios Locales" concentran, respectivamente, el 3,4% y el 1,3 % del total de actuaciones.

Tabla 1: Análisis de las actuaciones presentadas en los Programas IZARTU II en función de los ámbitos de intervención. Año 2009.

ACTUACIONES POR EJES Y MEDIDAS	Nº	%
EJE 1. ENTORNO PRODUCTIVO	11	3,4%
1.1. Creación y desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad	6	1,9%
1.2. Creación y desarrollo de infraestructura productiva	1	0,3%
1.3. Apoyo al empresariado, PYMES y empresas artesanales	1	0,3%
1.4. Promoción local, turismo y patrimonio	3	0,9%
EJE 2. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS LOCALES	247	77,2%
2.1. Infraestructuras de Transporte	20	6,3%
2.2. Infraestructura Telecomunicación y Sociedad de la Información	3	0,9%
2.3. Infraestructura Energética	6	1,9%
2.4. Infraestructura Medioambiental	39	12,2%
2.5. Infraestructuras Ordenación y Rehabilitación	159	49,7%
2.6. Infraestructura Social y Sanitaria	7	2,2%
2.7. Infraestructura Ocio y Cultura	11	3,4%
2.8. Infraestructura Educativa y Formativa	2	0,6%
EJE 3. INTEGRACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS LOCALES	4	1,25%
3.1. Integración Social	1	0,3%
3.2. Igualdad de oportunidades	1	0,3%
3.3. Educación y formación cívica	0	0,0%
3.4. Seguridad ciudadana	0	0,0%
3.5. Servicios sociales y asistenciales	0	0,0%
3.6. Servicios socio-culturales	1	0,3%
3.7. Otros servicios locales básicos	1	0,3%
EJE 4. ASISTENCIA TÉCNICA	58	18,1%
5.1. Asistencia técnica	58	18,1%


Finalmente, la clasificación territorial atiende a las comarcas beneficiarias del Programa que incluyen a los 68 municipios y se reparten por toda la CAPV, abarcando los tres Territorios Históricos: **Álava** - Llanada Alavesa-, **Bizkaia** -Alto Nervión, Arratia-Nervión, Bilbao, Duranguesado, Encartaciones, Gernika-Bermeo, Margen Derecha, Margen Izquierda, Markina-Ondarroa, Plentzia-Mungia y Txoriherri- y **Gipuzkoa** -Alto Deba, Bajo Bidasoa, Bajo Deba, Donostia-San Sebastián, Cinturón Oriental y Cinturón Occidental de Donostialdea, Goierri, Tolosa y Urola Kosta -.

3.1.1. Ejecución financiera de la intervención durante el 2009.

El gasto ejecutado durante el año 2009 por parte de los Programas Izartu 2004-2010, asciende a **20.876.264 €** lo que significa una adecuación a la programación de gasto para el año (23.099.976 €) de más del 90%.

La ejecución media de los 39 Programas que continúan en curso en el año 2009 asciende a 535.289 €, esta cantidad se ha visto incrementada de manera progresiva durante el transcurso del Programa. En este sentido, solventadas las dificultades iniciales en la puesta en marcha de las actuaciones, **el esfuerzo inversor es mayor en los últimos años de ejecución de los Programas.**


Gráfico 1: Ejecución media de los programas Izartu 2004-2009.

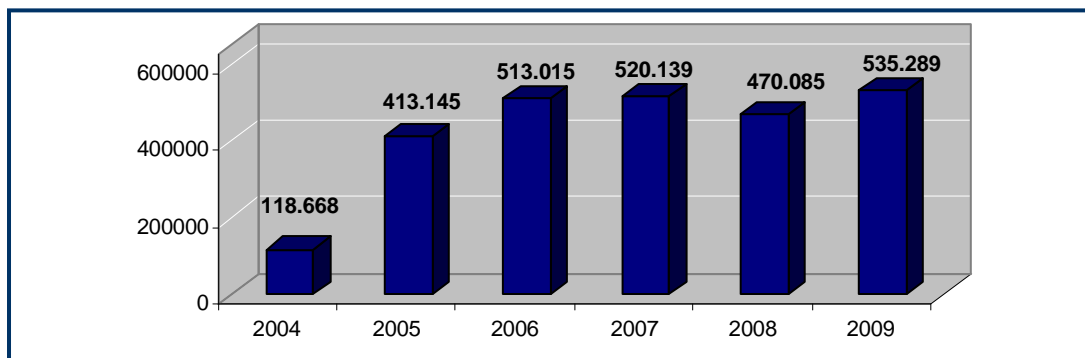

Acorde con la madurez del Programa, el **gasto acumulado en todo el periodo** (2004-2009) es **de 155.919.143 €, el 90,16% de la inversión total prevista.**

Con relación a los ámbitos de intervención, el grado de adecuación a la programación lo marca el EJE 2, que concentra la mayor parte de las actuaciones e inversión. Dentro del mismo, superan esta media de ejecución del gasto programado para el año las medidas *2.8 Infraestructura educativa y formativa, 2.2. Infraestructura Telecomunicación y Sociedad de la Información y 2.5 Infraestructuras de ordenación y rehabilitación*. Por debajo de esta media, y con un mayor retraso respecto a su programación, se encuentra la medida *2.1 Infraestructuras de transporte*.


Gráfico 2: Ámbitos de Intervención. Gasto efectuado en 2009 por los Programas Izartu II respecto a la programación para dicho año.

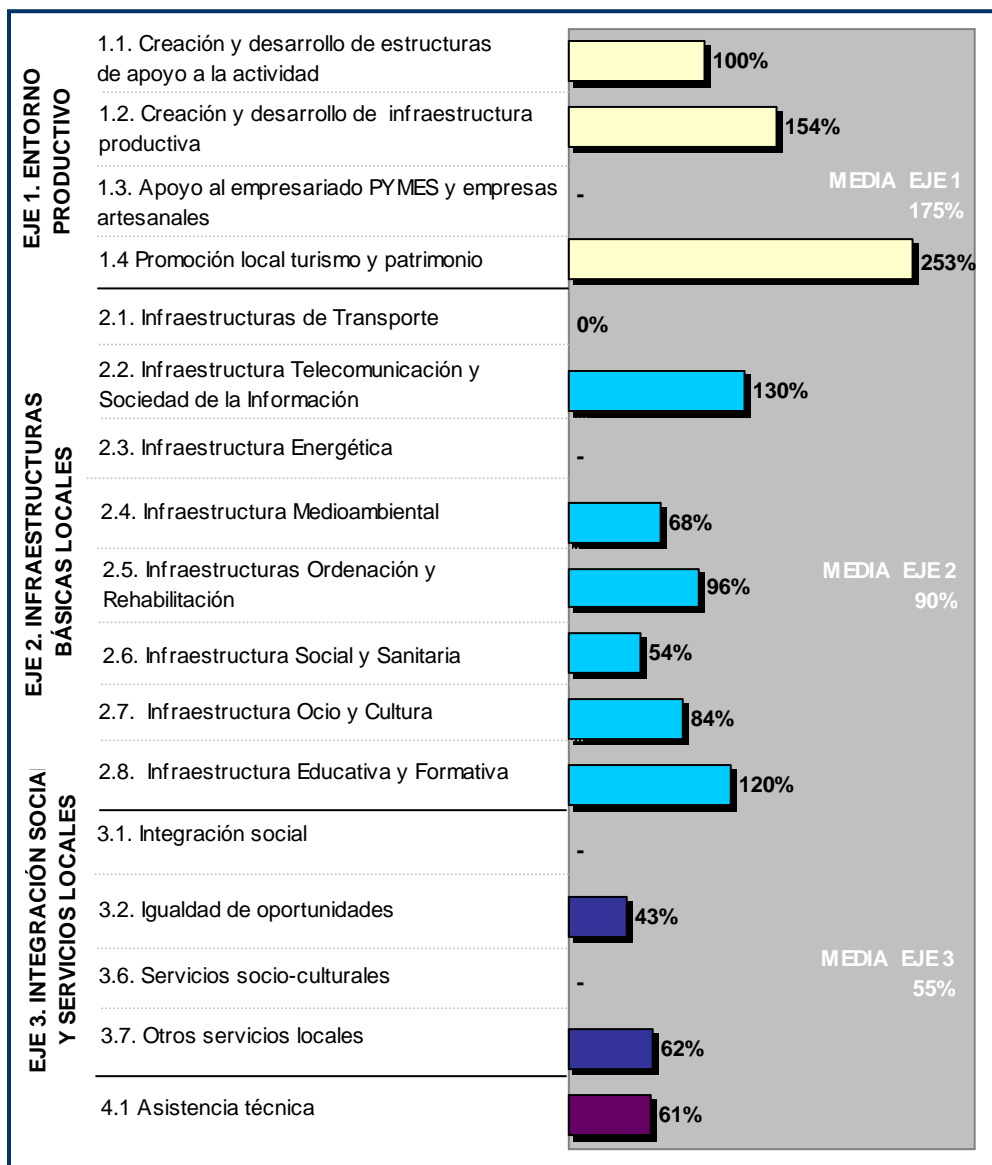

El EJE 1 y el EJE 3, con menos actuaciones, presentan diferentes grados de ejecución, con una media de gasto frente a la programación del 175% y 55%, respectivamente. La medida 3.2 *Igualdad de oportunidades* es la más retrasada.

Desde una perspectiva territorial también se observan diferencias en cuanto a la adecuación de los gastos a la programación. Álava y Gipuzkoa superan sus previsiones de ejecución en 2009, con un 111% y 135% del gasto ejecutado respectivamente, mientras que la adecuación al gasto programado en el territorio de Bizkaia es de un 51%.

Gráfico 3: Comarcas. Gasto efectuado en 2009 por los Programas Izartu II respecto a la programación para dicho año.

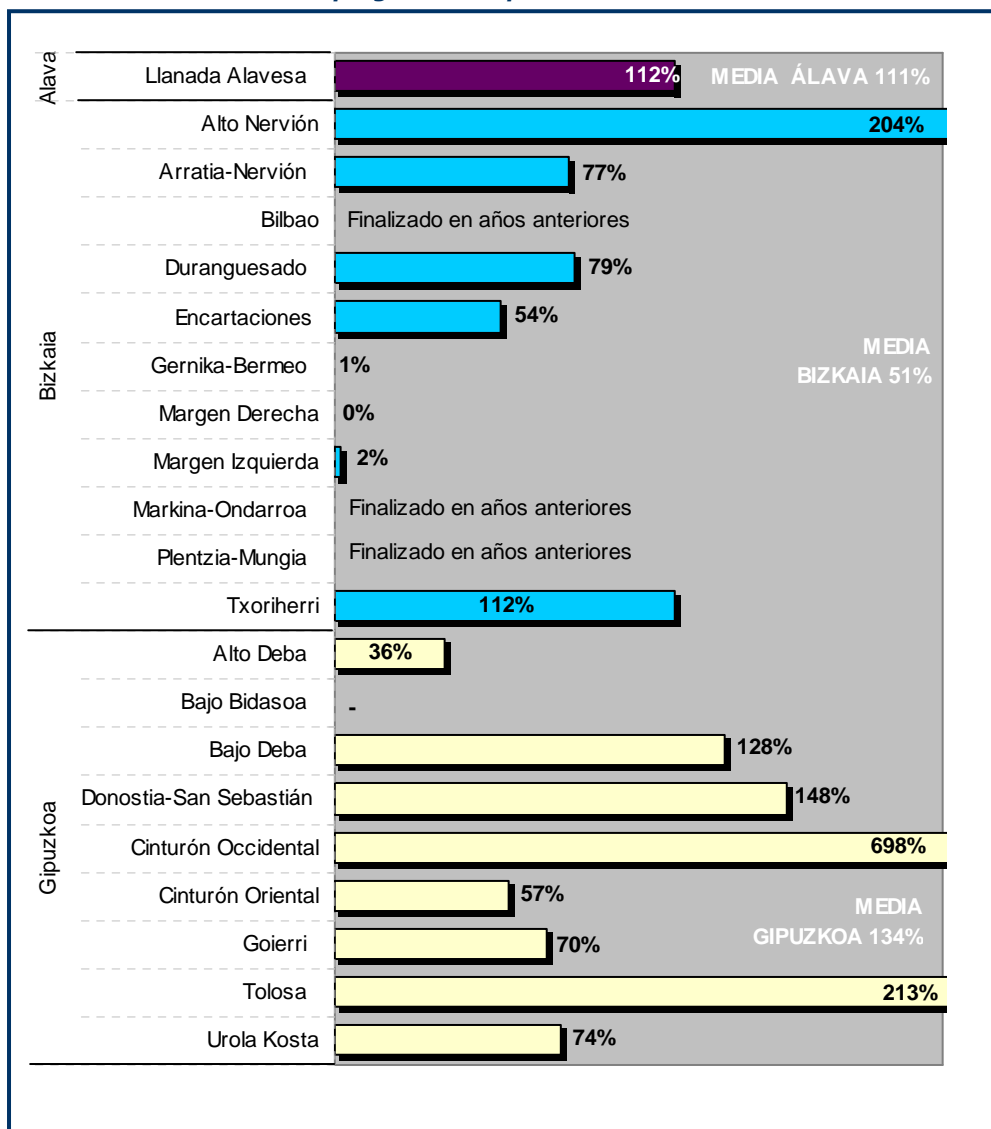

Esta menor adecuación al gasto programado en Bizkaia se debe principalmente a las comarcas de *Gernika-Bermeo*, *Margen Derecha* y *Margen Izquierda* que ejecutan muy por debajo de sus previsiones de gasto para el ejercicio de referencia. Por otra parte, siete comarcas beneficiarias presentan un esfuerzo inversor superior a su programación: *Llanada Alavesa*, *Alto Nervión*, *Bajo Deba*, *Cinturón Occidental*, *Donostia-San Sebastián*, *Tolosa* y *Txoriherri*.

3.1.2. Modificaciones y desviaciones respecto a la programación.

De los 68 municipios beneficiarios del Programa Izartu 2004-2008, en el año 2009 quedaban 39 Programas en ejecución, de los cuales 12 culminan su actuación con éxito al finalizar el ejercicio. Así, 27 municipios han prorrogado su ejecución hasta 2010.

Tabla 2: Programas IZARTU II atendiendo al año de finalización (real o previsto).

Programa finalizado en 2006	Hondarribia.
Programas finalizados en 2007	Abanto y Ciérvana, Andoain, Otxandio y Zegama.
Programas finalizados en 2008	Areatza, Arrigorriaga, Balmaseda, Bilbao, Elorrio, Errenteria, Etxebarri, Galdakao, Güeñes, Igorre, Legorreta, Lekeitio, Lemoiz, Markina-Xemein, Mungia, Orío, Portugalete, Sopuerta, Tolosa, Ugao-Miraballes, Vitoria-Gasteiz, Zaldibia, Zalla y Zierbena.
Programas finalizados en 2009	Antzuola, Arrasate/Mondragón, Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Durango, Erandio, Ermua, Hernani, Karrantza Harana/Valle de Carranza, Legazpi, Salvatierra-Agurain, Zeanuri.
Programas con prórroga hasta 2010	Amorebieta-Etxano, Artzentales, Ataun, Azpeitia, Basauri, Bergara, Bermeo, Derio, Elgoibar, Eskoriatza, Gernika-Lumo, Ibarra, Irun, Iurreta, Lasarte-Oria, Leioa, Lezo, Mallabia, Mutriku, Oiartzun, Segura, Sestao, Sorluze-Placencia de las Armas, Trucios-Turtzioz, Valle de Trápaga/ Trapaga harana, Villabona y Zumaia.


Por otra parte, **en el ejercicio 2009 se aprueban 9 solicitudes de modificación respecto a la programación original.** En su mayoría, estas modificaciones corresponden a trasvases presupuestarios con relación a los importes totales previstos en las actuaciones. El resto de las modificaciones se refieren a la incorporación de nuevas actuaciones (una actuación nueva) o a su eliminación (dos actuaciones eliminadas) respecto al programa en vigor.

Tabla 3: Municipios que han modificado su programación a lo largo de 2009.

Programas con modificación en 2009	Artzentales, Astigarraga, Donostia-San Sebastian, Erandio, Durango, Hernani, Lezo, Oiartzun y Segura.
---	---

Al margen de estas modificaciones y atendiendo a la adecuación del gasto ejecutado para el año, no se han dado grandes desviaciones en los Programas Izartu con relación a la programación para 2009. Es de destacar que **más del 60% de los municipios beneficiarios en situación de prórroga registran ejecuciones iguales o superiores** a sus previsiones y sólo un 38% de los municipios presentarían una ejecución relativamente menor.

Gráfico 4: Municipios. Desviaciones respecto a la programación de 2009 de los Programas Izartu II.

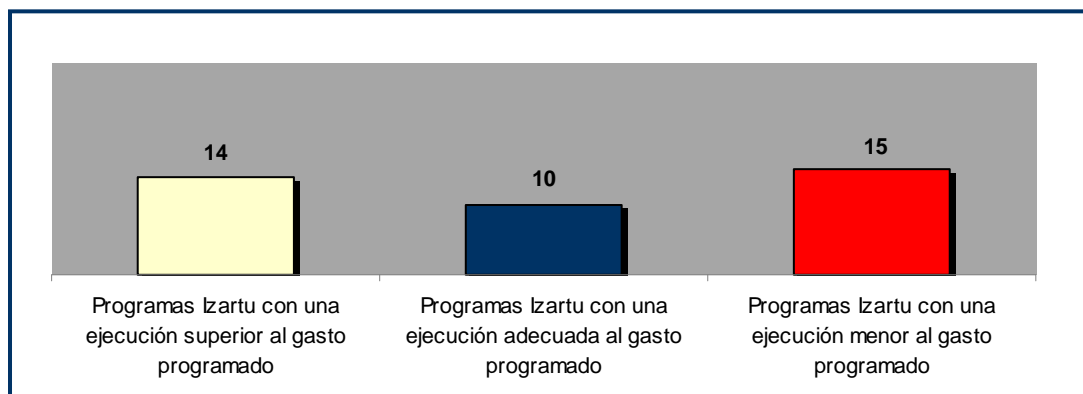

Las causas de una mayor ejecución del gasto se sitúan principalmente en el encarecimiento de las actuaciones por la introducción de mejoras, ampliación del alcance o incremento de los costes con relación a las previsiones iniciales argumentados por la aparición de contratiempos, derivados de las condiciones climatológicas adversas o de retrasos generales en la ejecución de las obras.


Por el contrario, los Programas más retrasados, aquellos con menor gasto ejecutado con relación a la inversión, apuntan a la situación económica actual, a la complejidad de las gestiones urbanísticas o a los retrasos derivados de trámites e interdependencias con otros proyectos como principales causas de una menor ejecución. A pesar de estas desviaciones registradas, la mayoría de sus responsables locales destaca la viabilidad del Programa y su finalización en 2010.

Tabla 4: Municipios con desviaciones en la ejecución de la inversión subvencionable.

Superávit de ejecución del gasto programado.	Antzuola, Astigarraga, Basauri, Derio, Donostia-San Sebastián, Durango, Elgoibar, Hernani, Legazpi, Salvatierra/Agurain, Segura, Soraluze-Placencia de las Armas, Villabona y Zumaia.
Menos de un 50% de la inversión ejecutada.	Bermeo, Leioa, Sestao, Trucios-Turtzioz y Valle de Trapaga-Trapagaran.

En esta línea, **el ejercicio 2009 destaca por un alto grado de cumplimiento de la programación** con menor número de actuaciones con desviaciones en comparación a periodos anteriores. En este sexto año, **en más de un 50% de las 185 actuaciones de los Programas en ejecución no se produce ninguna desviación**, el 19% de las desviaciones se corresponden con una ejecución superavitaria y un solo un 28% de las actuaciones presentan ejecuciones inferiores al 80% de la programación.

Gráfico 5: Actuaciones. Desviaciones respecto a la programación de 2009 de los Programas Izartu II.

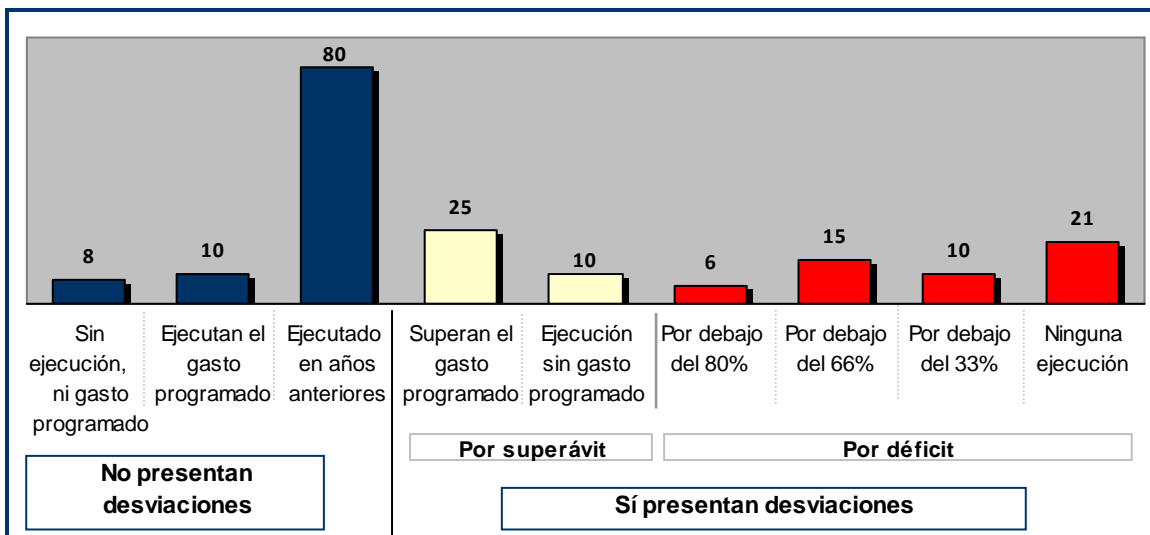


3.2

VALORACIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA BAJO LAS PERSPECTIVAS FUNCIONAL Y TERRITORIAL

3.2.1. Avance del Programa atendiendo a la inversión.

A un año de finalización de la iniciativa, **el gasto acumulado en el periodo 2004-2009 asciende a 155.919.143 €, el 90% de la inversión total prevista** bajo el Programa Izartu.

Gráfico 6: Avance de Programas en el periodo 2004-2009 respecto a la inversión total.

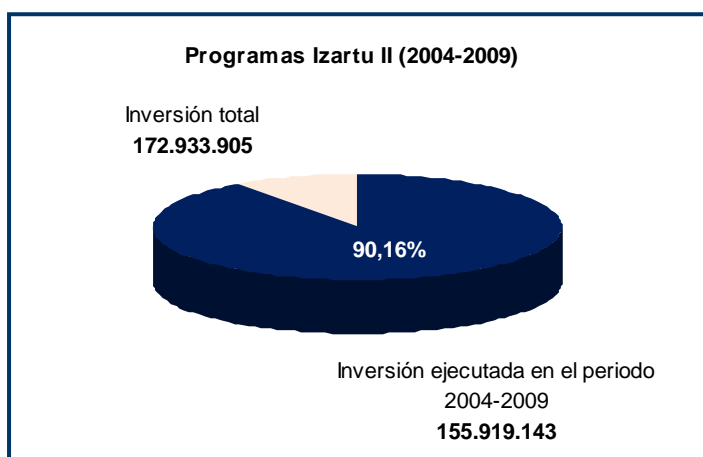


Dejando al margen las actuaciones relacionadas con la asistencia técnica y atendiendo a las actividades realizadas durante el periodo 2004-2009, podemos observar que los ámbitos de intervención en conjunto avanzan de manera similar, no así si descendemos a nivel de medidas.

Atendiendo tanto a la ejecución del gasto como de las actuaciones, las medidas 1.2. Creación y desarrollo de infraestructura productiva, 2.2 Infraestructura Telecomunicación y Sociedad de la Información, 2.3 Infraestructura Energética y 2.8 Infraestructura Educativa y Formativa han finalizado a lo largo de 2009. A las mismas se suman las medidas 1.3 Apoyo al empresariado PYMES y empresas

artesanales, 2.6 Infraestructura social y sanitaria, 3.1 Integración social y 3.6 Servicios socio-culturales que finalizaron en años anteriores.

La medida 2.7 Infraestructura Ocio y Cultura presenta **superávit** de ejecución aunque todavía no tiene finalizadas la totalidad de sus actuaciones. Con un avance superior a la media (90%) se encuentran las medidas 1.4 Promoción local turismo y patrimonio y 2.1 Infraestructuras de transporte. Por el contrario, las medidas 1.2. Creación y desarrollo de infraestructura productiva, 2.4. Infraestructura medioambiental y 3.2 Igualdad de oportunidades están más rezagadas con una ejecución por debajo del 85% de la inversión total.


Gráfico 7: Ámbitos de Intervención. Gasto acumulado en el periodo 2004-2009 por los Programas Izartu II respecto a la inversión total.

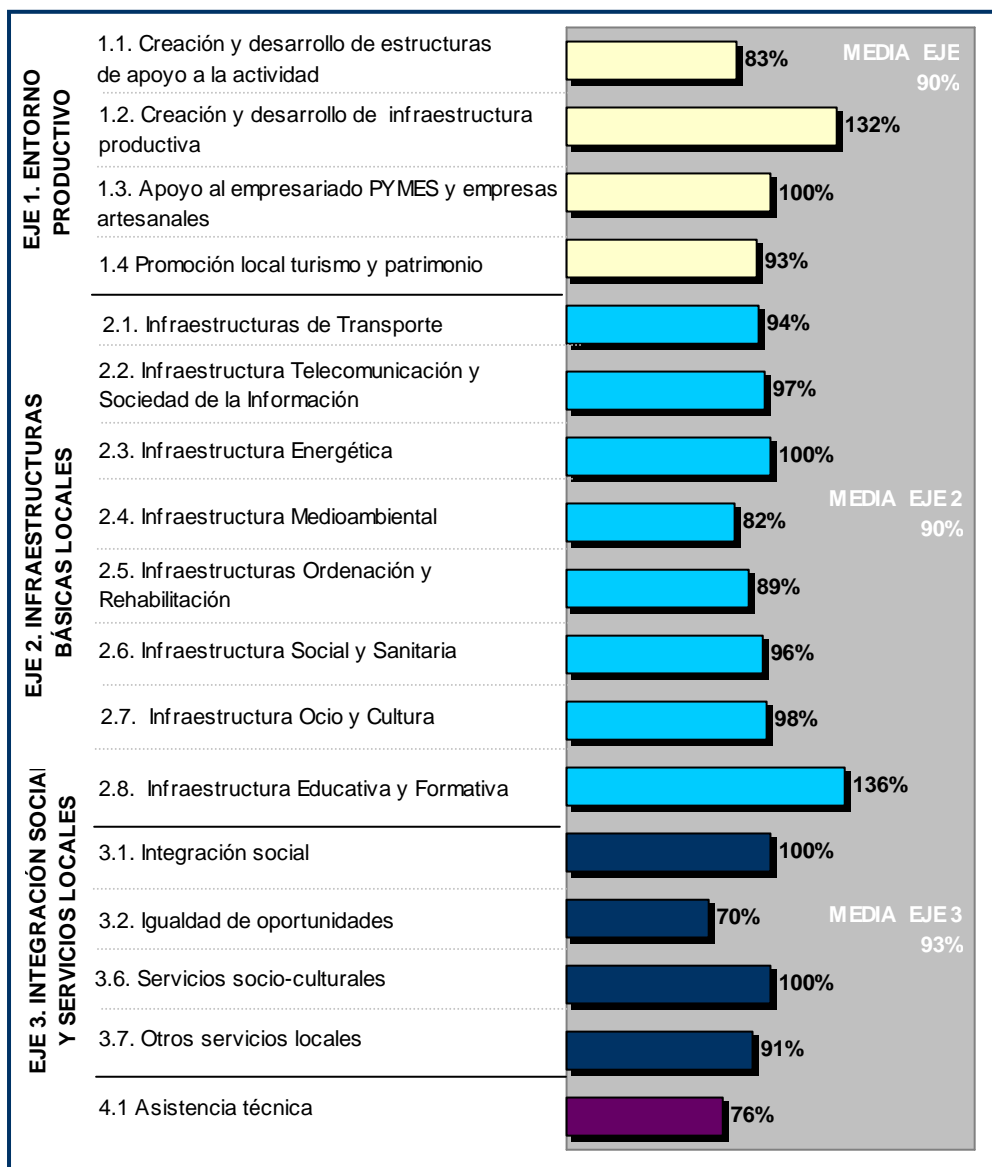

Desde una perspectiva territorial, **Álava es el territorio más avanzado, habiendo finalizado la ejecución del Programa Izartu** con aproximadamente una inversión de 6 millones de euros. En Guipúzcoa se ha acometido el 96% de la inversión, 76,5 millones de euros, mientras que en Bizkaia se ha ejecutado el 84% de la inversión subvencionable, con un gasto acumulado de 73,5 millones de euros.

Por comarcas, han finalizado *Arratia Nervión, Bilbao, Donostia- San Sebastián, Llanada Alavesa, Markina-Ondarroa y Plentzia-Mungia*. Presentan una ejecución superior a la media (90%) las comarcas de *Alto-Nervión, Bajo Deba, Goierri, Txoriherri y Urola Kosta*. Las más retrasadas con relación al avance medio son, *Margen Derecha, Margen Izquierda y Gernika-Bermeo*.

Gráfico 8: Comarcas. Gasto acumulado en el periodo 2004-2009 por los Programas Izartu II respecto a la inversión total.

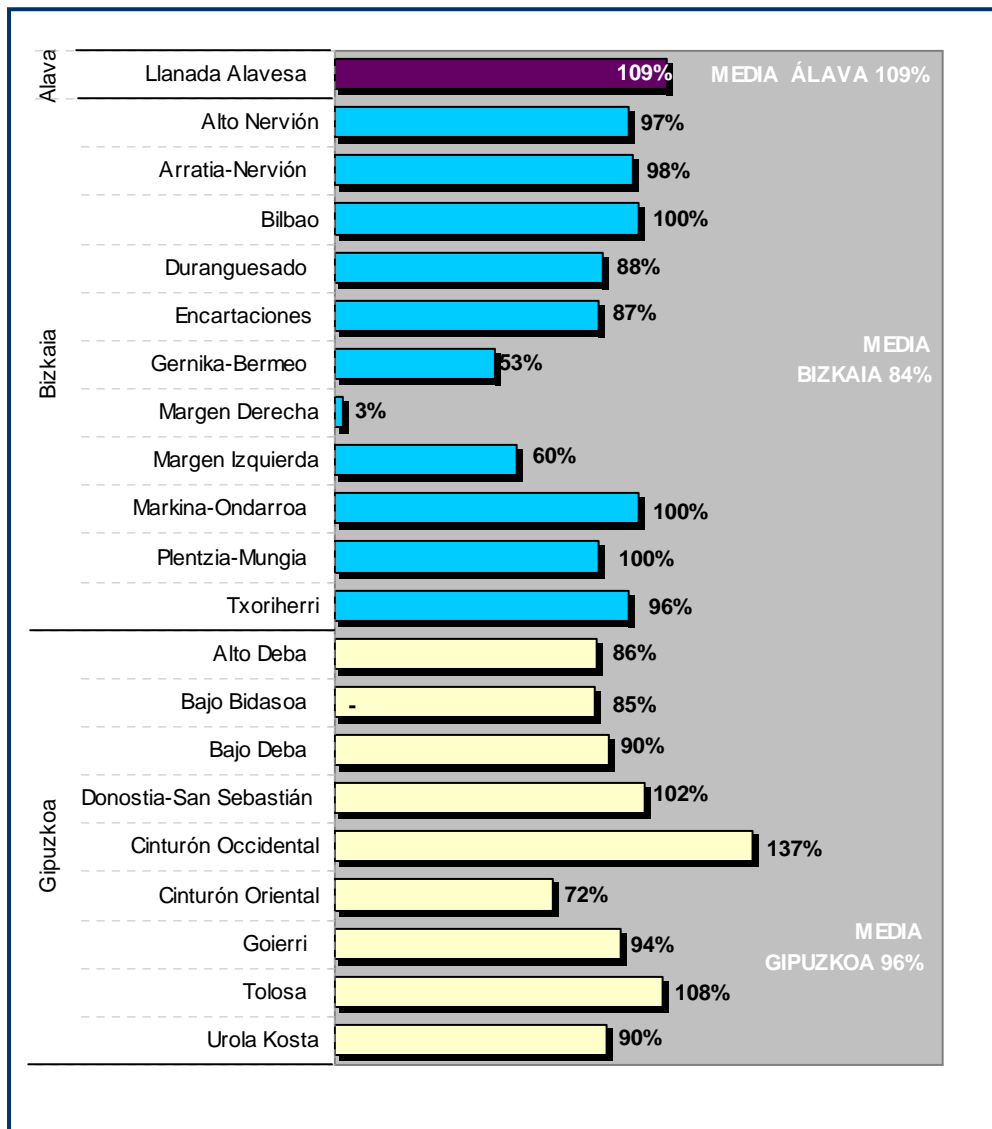

3.2.2. El esfuerzo inversor local y subvenciones percibidas.

De la parte de cofinanciación al Programa Izartu 2004-2010 que concierne a los ayuntamientos beneficiarios, **aproximadamente el 37% como media se corresponde al esfuerzo inversor local**. Recordar en este sentido, que entre los beneficiarios este esfuerzo varía dependiendo de la tasa de cofinanciación, ya que en base a los criterios definitorios de deterioro socio-económico, se establece un porcentaje de ayuda del 30%, 50% o 75% sobre la inversión subvencionable. Los Programas subvencionados con un 75% sobre la inversión han sido 47; 17 municipios han recibido una ayuda del 50% y 4 han recibido una ayuda del 30%.

Por tanto, **de los 155,92 millones de euros ejecutados** en el periodo 2004-2009 por los Programas Izartu II, teniendo en cuenta la subvención concedida por Izartu, **cerca de 57,7 millones de euros corresponden**, aproximadamente y como media, **al esfuerzo inversor local**.

Por otra parte, los Programas son compatibles con otras subvenciones y ayudas procedentes del resto de administraciones y organismos, lo que representa una importante ayuda en algunos casos a la parte de cofinanciación municipal, si bien se establecen incompatibilidades con ayudas recibidas de otros departamentos o programas específicos de Gobierno Vasco.

A lo largo del **2009 se han percibido 3.480.779,87 € en concepto de otras ayudas y subvenciones** a las actuaciones enmarcadas en el Programa Izartu II. La cantidad recibida por los municipios beneficiarios en todo el periodo (2004-2009) asciende a 17.962.774,95 €, lo que representa el 12% del gasto total ejecutado y se corresponde con el 31% de media del esfuerzo económico local. Aunque se trata de una cantidad importante, sólo un 20% de las 262 actuaciones que se enmarcan en el Programa Izartu II han percibido este otro tipo de ayudas, es decir 52 actuaciones. Con relación a los municipios sólo un 40% de los mismos, 27 ayuntamientos, han recibido esta aportación exterior al Programa.

Tabla 5: Ayudas y financiación municipal en la inversión ejecutada 2004-2009 por los Programas Izartu II.

INVERSIÓN	Acumulado (2004-2009)
SUBVENCIÓN IZARTU	98.229.060,3 €
OTRAS AYUDAS	17.962.775 €
COFINANCIACIÓN MUNICIPAL	39.727.308 €
TOTAL	155.919.143,3 €

Respecto a la tipología, las actuaciones que han recibido subvenciones en el ejercicio 2009 se enmarcan en las medidas *2.5 Infraestructuras de ordenación y rehabilitación*, *2.7 Infraestructuras de ocio y cultura* y *2.4. Infraestructura medioambiental* y *2.3 Infraestructura energética*. En cuanto a la procedencia de dichas ayudas las Diputaciones Forales son las entidades de donde provienen la mayor parte de recursos, departamentos de Medioambiente, Cultura, Política Social, Movilidad y Ordenación del Territorio. Otros organismos que han subvencionado a lo largo del año 2009 son las ayudas Fondo Estatal de Inversión Local y Osakidetza.


3.2.3. Valoración del avance desde una visión integral por los Ayuntamientos.

Desde una visión integral del Programa Izartu, la valoración realizada por los responsables locales sobre la marcha de las actuaciones es muy positiva, estas valoraciones coinciden con los favorables resultados señalados a lo largo de los apartados anteriores.

De los 39 beneficiarios con Programas en vigor en 2009, **el 91% de los municipios valoran muy positivamente** la ejecución hasta el momento y el impacto obtenido en la regeneración de núcleos urbanos que por falta de recursos estaban sufriendo un proceso degenerativo.

Un 3% de los municipios beneficiarios relativizan el grado de satisfacción con la iniciativa por los retrasos y problemas que han venido padeciendo a lo largo de estos años y que les ha impedido alcanzar una mayor ejecución (demoras en los plazos de ejecución de las obras, complejidad de las gestiones urbanísticas y trámites, situación económica actual,..).

Gráfico 9: Valoración de la satisfacción con la marcha del Programa Izartu II

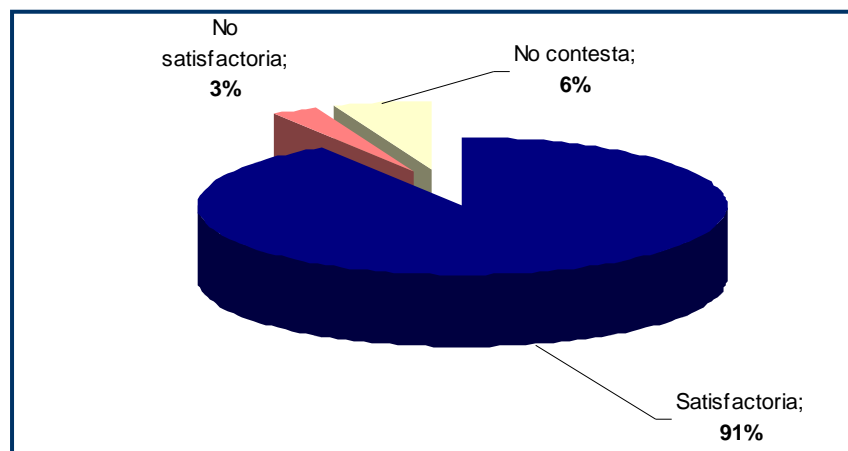

El alto grado de satisfacción de los equipos locales responsables de los Programas se justifica por el avance de los proyectos conforme a las expectativas municipales. Así, **el 60% de los Programas Izartu II han finalizado** y a los 29 municipios que finalizaron en ejercicios anteriores, en el año 2009 se suman otros 12 que en el año 2009 culminan la ejecución de sus Programas: Antzuola, Arrasate/Mondragón, Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Durango, Erandio, Ermua, Hernani, Karrantza Harana/Valle de Carranza, Legazpi, Salvatierra-Agurain y Zeanuri.

Pero esencialmente, esta positiva visión integral sobre la marcha de los Programas procede, como en años anteriores, del impacto notable que las actuaciones finalizadas están teniendo sobre la mejora de la imagen y calidad de vida de los habitantes en los municipios beneficiarios. En esta línea, **de las 262 actuaciones enmarcadas en el conjunto de los Programas Izartu II** (sin contar las actividades de asistencia técnica), **han finalizado en este periodo 215, es decir, el 82%.**

Tabla 6: Análisis de las actuaciones terminadas en los Programas IZARTU en función de los ámbitos de intervención. Año 2009.

ACTUACIONES POR EJES Y MEDIDAS	Total actuaciones	Actuaciones acabadas	%
EJE 1. ENTORNO PRODUCTIVO	11	9	82%
1.1. Creación y desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad	6	5	83%
1.2. Creación y desarrollo de infraestructura productiva	1	1	100%
1.3. Apoyo al empresariado, PYMES y empresas artesanales	1	1	100%
1.4. Promoción local, turismo y patrimonio	3	2	67%
EJE 2. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS LOCALES	247	204	83%
2.1. Infraestructuras de Transporte	20	19	95%
2.2. Infraestructura Telecomunicación y Sociedad de la Información	3	3	100%
2.3. Infraestructura Energética	6	6	100%
2.4. Infraestructura Medioambiental	39	32	82%
2.5. Infraestructuras Ordenación y Rehabilitación	159	127	80%
2.6. Infraestructura Social y Sanitaria	7	7	100%
2.7. Infraestructura Ocio y Cultura	11	10	91%
2.8. Infraestructura Educativa y Formativa	2	2	100%
EJE 3. INTEGRACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS LOCALES	4	2	50%
3.1. Integración Social	1	1	100%
3.2. Igualdad de oportunidades	1	0	0%
3.6. Servicios socio-culturales	1	1	100%
3.7. Otros servicios locales básicos	1	0	50%

Respecto a las actuaciones finalizadas, los responsables locales destacan la evidente mejoría del medio físico urbano con los proyectos ejecutados, proyectos que en la mayoría de los casos no hubiesen sido posibles de acometer con los escasos recursos municipales.

Cabe señalar que los municipios beneficiarios también de la primera convocatoria del Programa Izartu (Programa Izartu 2001-2005) constatan que esta segunda iniciativa ha sido un complemento con el cual se ha conseguido en muchos casos revertir totalmente los procesos de degradación urbanísticos y socioeconómicos de las zonas donde se ha intervenido.

Otros aspectos transversales como la valoración positiva del trabajo interdepartamental y entre diferentes niveles institucionales, la necesidad de planificar y la orientación integral del Programa y filosofía de definición e implantación desde el nivel local han sido también señalados por los responsables para mostrar su satisfacción con el Programa izartu.

Tabla 8: Aspectos más valorados de las actuaciones finalizadas en los Programas Izartu II


<p><i>"La opinión vecinal corrobora las conquistas y mejoras experimentadas por el municipio en estos últimos cinco años, se percibe que actuaciones como estas son fundamentales para la vida social del municipio y para la calidad de vida de sus habitantes. (..) IZARTU ha contribuido de manera importante a superar los principales obstáculos que frenaban el desarrollo urbanístico y de infraestructuras del municipio, abordando de manera planificada y secuencial los diferentes proyectos. La acometida de los proyectos ha supuesto una mayor cohesión urbana, haciendo a una parte de la población partícipe de una imagen de cambio y renovación de estructuras obsoletas."</i></p>
<p><i>"El impacto realmente es importante tanto en la regeneración urbanística como en la recuperación de espacios marcando un antes y después muy diferente tras el Programa Izartu II. La Revitalización Urbana es palpable en múltiples aspectos visibles. y otros muchos invisibles."</i></p>
<p><i>"El Programa Izartu II brindó una oportunidad única para emprender una estrategia integral de regeneración."</i></p>
<p><i>"Esta sirviendo de detonante para la regeneración del barrio. Se ha realizado de forma participativa y planificada y ha servido de elemento tractor para el desarrollo del Municipio."</i></p>
<p><i>"Izartu supone una importante ayuda financiera que sirve de estímulo para formular y acometer proyectos de fuerte impacto en la ciudad, tanto por su contenido como por su dimensión. Con respecto al Programa IZARTU anterior se valora muy positivamente que por parte del Gobierno se haya recogido el sentir, por lo menos de éste Ayuntamiento."</i></p>
<p><i>"El Programa Izartu ha sido un buen instrumento para la regeneración urbana y la cohesión social. Asimismo, al ser un instrumento descentralizado, ha posibilitado que sea gestionado por los agentes más cercanos al área de actuación, es decir, los Ayuntamientos, lo cual ha permitido una mayor eficacia."</i></p>

3.2.4. Gestión y difusión del Programa.

Como en la primera convocatoria, la mayor parte de los beneficiarios del Programa Izartu II cuentan con asistencias técnicas externas, de forma puntual o permanente, que apoyan la gestión, seguimiento y control de los Programas Izartu Locales.

En el año 2009, el 77% de **los beneficiarios del Programa Izartu II**, 30 municipios, **han contratado actividades de asistencia técnica** externa por valor de 151.127 €. Este gasto es inferior a ejercicios anteriores dado el menor número de Programas Izartu en ejecución.

Gráfico10: Gasto en asistencia técnica al Programa Izartu II en el periodo 2004-2009.

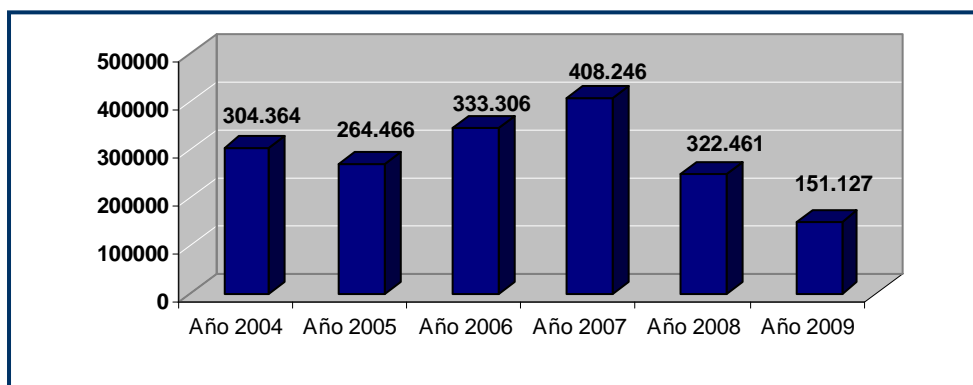


En todo el periodo, el gasto acumulado en esta medida de apoyo asciende a 1.729.669 € y representa un 1,1% de la inversión total ejecutada por el conjunto de los Programas Izartu **2004-2010**.

Las tareas que en mayor medida se han abordado por la asistencia técnica en el año 2009 han sido las relacionadas con la gestión, coordinación y control del proyecto a nivel local para la consecución de los objetivos perseguidos por el programa y cumplimiento de la normativa marcada así como la elaboración de los documentos asociados al seguimiento y control financiero. En segundo lugar de importancia destaca la elaboración de los Informes de Evaluación Final.

Respecto a las acciones de publicidad y difusión, el 72% de los municipios con actuaciones en ejecución en 2009 señala haber acometido actuaciones divulgativas de sus Programas. De las prácticas de publicidad adoptadas, más del 78% de los beneficiarios indica haber colocado carteles, paneles y vallas publicitarias en las zonas de intervención, dada la obligatoriedad de los mismos según la normativa que afecta al Programa Izartu.

En segundo lugar, en un 26% de los Programas, estarían los canales municipales de información (web local, boletines y revistas locales, buzoneo, exposiciones públicas de los proyectos...) como práctica informativa de cara a la ciudadanía, seguido de las campañas publicitarias, artículos en prensa regional y otros medios audiovisuales (Radio, TV local, autonómica) utilizados como medio de difusión por un 13% de los beneficiarios en el año 2009.

Gráfico 11: Herramientas de comunicación, información y difusión utilizadas en el año 2009.

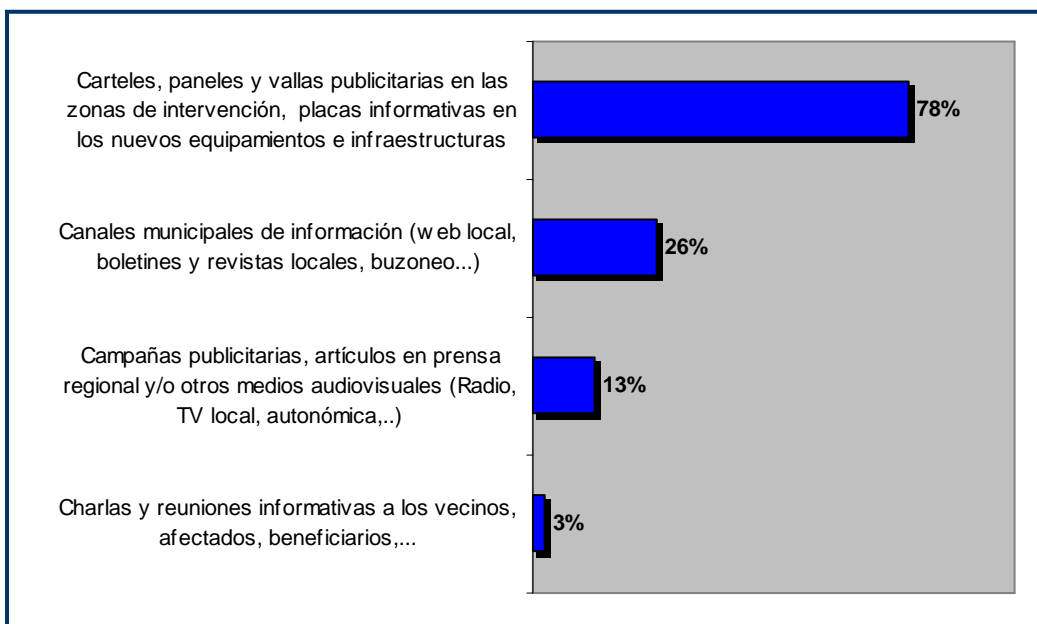

4. Memoria de avance en los Procesos de Revitalización Urbana

4.1


AVANCE EN LOS OBJETIVOS: INVERSIÓN Y REALIZACIONES

El propósito de este capítulo es analizar la contribución de los Programas a los objetivos de transformación definidos para el Programa Izartu. Para ello nos centraremos en el **grado de consecución de los resultados previstos de las actuaciones ejecutadas bajo los Programas Izartu durante el periodo 2004-2009 y su impacto sobre los objetivos generales de cohesión**.

De la misma manera que la primera edición del programa tenía por objeto promover la regeneración socio-económica de las zonas urbanas desfavorecidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la presente edición continua favoreciendo el alcance de estos objetivos mediante **actuaciones de carácter integral** (Programas Integrados de Revitalización Urbana) **donde se aborden de forma conjunta todos aquellos problemas específicos de dichas zonas** (sociales, económicos, medioambientales, etc.). El **objetivo último** de todas estas acciones es el de **alcanzar su cohesión territorial, económica y social**.

Es por ello que las actuaciones subvencionadas por el Programa Izartu se concentran, con carácter general y atendiendo a la tipología de la acción y finalidad o impactos esperados, en uno o varios de los siguientes objetivos generales de cohesión:

SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL



- El Programa Izartu II enmarca 58 actuaciones bajo este objetivo que representan el 19% de la inversión total.
- Dichas actuaciones contemplan la mejora de la accesibilidad y condiciones urbanas en barrios o áreas más periféricas, o centradas en superar barreras físicas y tejer una trama urbana más cohesionada a través de nuevos accesos peatonales y rodados, escaleras y rampas mecánicas, planes de accesibilidad y movilidad,...

RECUPERACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS DETERIORADOS Y/O ABANDONADOS




- El Programa Izartu II enmarca 106 actuaciones en este objetivo que representan el 49% de la inversión total.
- Las actuaciones están destinadas a la recuperación de entornos naturales, industriales y urbanos y áreas degradadas, dotación de espacios y equipamientos para el disfrute del medio ambiente.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES URBANAS



- El Programa Izartu II enmarca 60 actuaciones en este objetivo que representan el 20% de la inversión total.
- Las actuaciones se refieren a mejoras urbanísticas y de los servicios y redes municipales, mejora de la imagen urbana a través de la rehabilitación de cascos históricos, edificios y viviendas, dotación e instalación de infraestructuras urbanas, espacios públicos,...

APOYO AL EMPRESARIADO, PYMES, TURISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL



- El Programa Izartu II enmarca 20 actuaciones en este objetivo que representan el 6% de la inversión total.
- Los proyectos persiguen el incremento de las oportunidades para la creación y atracción de nuevas empresas y de negocio para las existentes, equipamientos urbanos para el desarrollo social y terciario y la promoción del turismo.

INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES



- El Programa Izartu II enmarca 6 actuaciones en este objetivo que representan el 3% de la inversión total.
- Las actuaciones se dirigen a la introducción de la fibra óptica y equipamientos municipales y a la digitalización de los servicios administrativos municipales, e-administración.


DISCRIMINACIÓN POSITIVA A FAVOR DE COLECTIVOS AMENAZADOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL



- El Programa Izartu II enmarca 12 actuaciones en este objetivo que representan el 3% de la inversión total.
- Proyectos correspondientes a servicios sociales y equipamientos de carácter terciario, centros socio-culturales, bibliotecas, espacios para la tercera edad, jóvenes o colectivos con riesgo de exclusión social, ..

Los objetivos con mayor número de actuaciones e inversión son *Solucionar problemas de integración territorial, Recuperación y mejora de espacios deteriorados y/o abandonados y Reducción del impacto ambiental de las actividades urbanas*. Estos objetivos, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, son los que marcan el ritmo de avance medio del Programa.

Gráfico 12: Objetivos generales de cohesión. Gasto efectuado en el periodo 2004-2009 respecto a la inversión total.

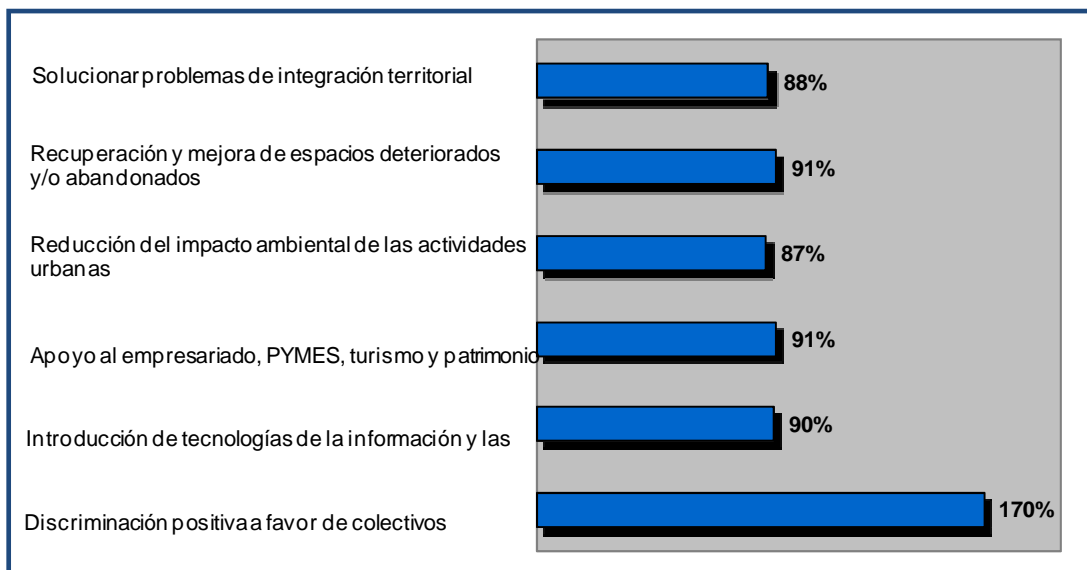

Así, desde el punto de vista económico, el objetivo más avanzado sería *Discriminación positiva a favor de colectivos amenazados de exclusión social y laboral con un 170% de ejecución.* Sin embargo, aun quedan actuaciones pendientes de finalizar en 2010 bajo este objetivo y el porcentaje de avance muestra un superávit de inversión del ayuntamiento de Hernani para el desarrollo de la actuación *Ampliación de la residencia de ancianos*. El resto de objetivos generales muestra un avance similar en la ejecución económica entre un 88% y 91% del total previsto.

En esta línea, **con relación a la ejecución de las realizaciones** (intervenciones en las que se dividen las actuaciones para completar el objetivo perseguido), **el progreso percibido por parte de los responsables locales**, medido a través de los indicadores de realización, **nos ofrece otra perspectiva** más descriptiva de la realidad de las actuaciones y avance de las mismas. Así, **el ritmo de ejecución de las realizaciones desde la óptica municipal es algo inferior a la ejecución económica, un 85%** sobre el total de lo previsto.

Por otro lado, este ritmo de ejecución de las actividades previstas (realizaciones) también varía con relación a los objetivos generales de cohesión. Por encima de la media señalada encontramos los siguientes objetivos: *Solucionar problemas de integración territorial, Introducción de las TICs y Discriminación positiva a favor de colectivos amenazados de exclusión social y laboral*. Por debajo del 85% de ejecución se encuentran los objetivos *Recuperación y mejora de espacios deteriorados o abandonados (82%), Reducción del impacto ambiental de las actividades urbanas (85%) y Apoyo al empresariado, PYMEs, turismo y patrimonio municipal (70%)*. El retraso se explica principalmente por demoras en los trámites administrativos, condiciones climatológicas, interdependencias o complejidad urbanística de los proyectos,..

Tabla 9: Objetivos generales de cohesión. Avance en las realizaciones en el periodo 2004-2009.

OBJETIVOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES	Nº	%
	Actuac.	Realizac.
SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL	58	99%
Viales y accesos creados o mejorados.	43	105%
Nuevos accesos mecánicos (rampas, escaleras, ascensores).	6	73%
Eliminación de barreras urbanísticas y descongestión de espacios peatonales.	2	100%
Adecuación de los niveles de calidad urbanística.	8	85%
RECUPERACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS DETERIORADOS O ABANDONADOS	106	82%
Recuperación de entornos industriales.	9	62%
Recuperación de entornos urbanos.	87	83%
Recuperación de entornos y parajes naturales.	10	87%
REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES URBANAS	61	83%
Mejora de redes e infraestructuras (saneamiento, alumbrado...)	35	95%
Peatonalización de calles y urbanización de plazas.	3	117%
Mejora de la imagen de cascos históricos y embellecimiento urbano.	5	88%
Mejora de las condiciones urbanas de barrios.	9	61%
Creación y de parques y áreas de esparcimiento, bidegorris,..	9	53%
APOYO AL EMPRESARIADO, PYMES, TURISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL	20	70%
Espacios y servicios para fomentar el emprendizaje y la creación de empresas y servicios de apoyo a la actividad empresarial	3	71%
Habilitación de áreas para la actividad industrial, comercial y terciaria	13	77%
Rehabilitación del patrimonio y espacios de interés turístico.	4	52%
INTRODUCCIÓN DE LAS TICS	6	100%
Dotación de equipamientos e infraestructuras para impulsar las NTICs.	3	95%
Fomento de la Sociedad de la Información y la e-Administración.		112%
DISCRIMINACIÓN POSITIVA A FAVOR DE COLECTIVOS AMENAZADOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL	11	103%
Equipamientos sociales y culturales.	8	108%
Servicios y programas municipales.	3	90%

4.2

RESULTADOS E IMPACTOS EN LOS PROCESOS DE REVITALIZACIÓN URBANA

En este apartado final, trataremos los principales resultados de las actuaciones finalizadas en cada objetivo así como los efectos o impactos en la consecución de los mismos, colocando especialmente el foco de atención en los Programas Izartu que han finalizado a lo largo de 2009.


Cabe señalar que en algunos casos, a pesar de la completa ejecución, si analizamos los impactos obtenidos los objetivos muestran un avance algo menor, dado que muchas de las nuevas infraestructuras y equipamientos aún no han producido todos los efectos esperados, que se materializarán principalmente en los próximos ejercicios.

4.2.1. Solucionar problemas de integración territorial.

Al finalizar el sexto año de ejecución del Programa Izartu **se han alcanzado el 83% de los resultados previstos** en el objetivo general de cohesión *Solucionar problemas de integración territorial.*

Bajo el mismo se enmarcan 58 actuaciones de las cuales prácticamente han finalizado el 90%. Entre los principales efectos obtenidos hasta el momento destacan los siguientes: se han creado y mejorado **73.300 m² de viales (25.186 sólo en 2009), 41 km de pasarelas, aceras, paseos** renovados así como nuevos equipamientos que facilitan la accesibilidad; **8 rampas, 10 escaleras mecánicas, 2 ascensores y nuevas plazas de aparcamiento** en las zonas intervenidas.

Gráfico 13: Contribución de los Programas Izartu a la "Integración territorial".

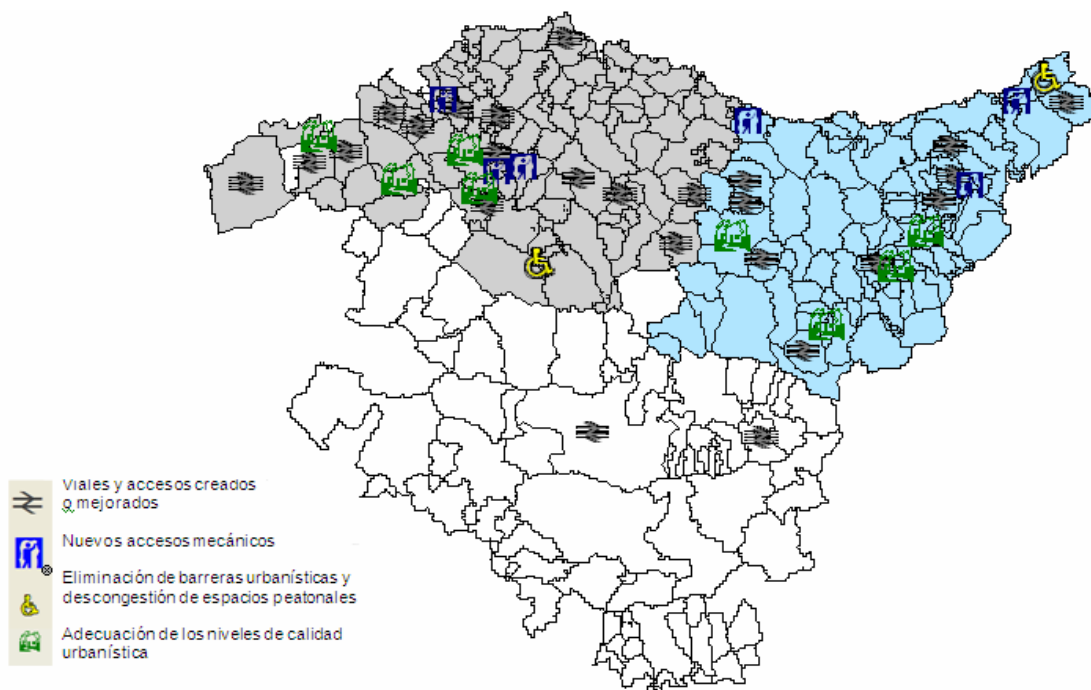

El desarrollo de estas actuaciones está permitiendo que 30 localidades consigan un entramado urbano **más vertebrado y accesible** para todos sus habitantes.

Responsables y técnicos locales destacan principalmente el grado de contribución al incremento de la accesibilidad peatonal y de la comunicación urbana y por ende, de la seguridad en las zonas donde se ha intervenido. Y en este sentido, los principales impactos resaltados por la población beneficiaria están siendo **el acercamiento de los barrios periféricos con los centros urbanos, el incremento de la calidad de vida de las personas con movilidad reducida** (personas discapacitadas, de avanzada edad,..), **el aumento de la interacción social derivado de un mayor tránsito** entre zonas urbanas al eliminar barreras tanto físicas como "psicológicas" **y la mejora del tráfico** gracias a ordenamientos urbanísticos que imposibilitan la invasión del tráfico rodado en espacios peatonales.


SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL

- *Construcción de un nuevo vial (170 m) que une el Barrio de Uzarraga y la Avenida de Lizarraga en **Antzuola** evitando el tránsito de tráfico pesado por el centro del municipio.*
- *Reurbanización de 1.500 m² de superficie en zonas degradadas de **Ermua** para mejorar la accesibilidad entre barrios periféricos.*
- *Ejecución de nuevos viales que comunican Uribe kalea y Almazene kalea en la localidad de **Derio**, actuando en una superficie aproximada de 11.000 m².*
- *Mejora en caminos y conexiones urbanas de **Karrantza Harana/Valle de Carranza** rehabilitando viales peatonales y rodados a lo largo de 21 Km de caminos vecinales entre Ambasaguas y La Tejera.*
- *Más de 9.000 m² de paseo rehabilitado o de nueva creación en varias zonas urbanas pertenecientes a **Lasarte-Oria** del área de influencia del río Oria.*
- *Integración ronda este del Casco Histórico de **Salvatierra/Agurain** a través de una nueva pasarela que conecta el barrio que se sitúa al este del Casco Medieval (más de 4.480 residentes beneficiados directamente).*
- *Programa de mejora de vialidad en el enlace norte de **Soraluce** por medio de la construcción de un nuevo puente que comunica ambos márgenes del río Deba, Paseo Mendiola y Baltegieta, a la altura de Sagar-Erreka. Mejora de la urbanización del Paseo de Mendiola incluyendo la reparación de firmes, mejoras en la red de saneamiento de pluviales y reposición de la barandilla.*
- *Construcción de una nueva pasarela sobre el río Oria en **Villabona**, peatonalizando más de 160 m² de superficie.*

4.2.2. Recuperación y mejora de espacios deteriorados y/o abandonados.

Siendo el objetivo que mayor inversión concentra dentro del Programa Izartu, el **81% de las 106 actuaciones se han completado** con éxito al finalizar el año 2009. Destacan como principales resultados la recuperación de 768.348 m² de superficie en entornos industriales, urbanos y naturales de los cuales, 18.000 m² han sido intervenidos en 2009. Asimismo del total de superficie mejorada más de 500.000 m² corresponden a espacio urbano público rehabilitado para nuevos usos y dotaciones y 29.500 m² pertenecen a entornos naturales degradados que han sido recuperados.

Gráfico 14: Contribución de los Programas Izartu a la "Recuperación y mejora de espacios"

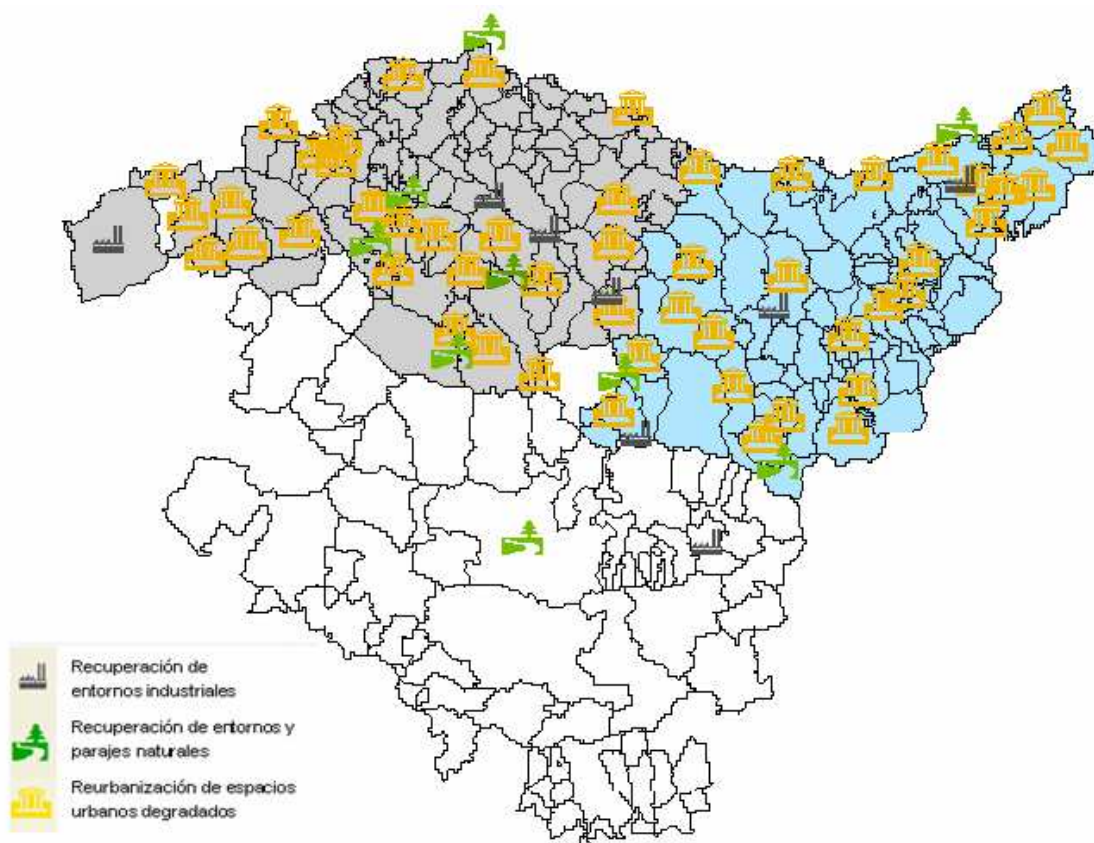

La realización de estas actuaciones ha sido determinante en la regeneración de diferentes áreas industriales, naturales o urbanas degradadas, posibilitando la reutilización de estos espacios en los municipios beneficiarios. Esta recuperación ha permitido la creación de **nuevos espacios para el beneficio y disfrute de todos sus habitantes**, trascendiendo su área de influencia en ocasiones a municipios colindantes. El programa Izartu II está posibilitando la **eliminación de edificios y espacios industriales en ruina** para nuevas dotaciones socioculturales tales como bibliotecas, muros, nuevos centros cívicos,... **Se han modernizado infraestructuras y redes de servicio** en muchas áreas adaptando el medioambiente urbano a los nuevos estándares urbanísticos de calidad de vida. **Se han incrementado los espacios públicos abiertos** y zonas para el desarrollo comunitario.

RECUPERACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS DETERIORADOS Y/O ABANDONADOS


- Ampliación de las aceras, aparcamientos en superficie y mejoras en el saneamiento, pavimento, iluminación, pintura y mobiliario en la C/Sabino Arana de **Amorebieta**, 450 m².
- Construcción de un edificio de usos múltiples en **Antzuola** de 2.070 m² de superficie para albergar gaztetxe-gaztegunea, biblioteca-hemeroteca, locales para actividades de grupos culturales, talleres para actividades diversas, etc.
- Rehabilitación del barrio Makatzeta en **Arrasate/Mondragon** actuando sobre una superficie de 15.540 m²: reurbanización del vial interior, pavimento, alumbrado, jardinería, reparación de muros y escaleras, acondicionamiento de las terrazas y voladizo existente.
- Reestructuración y construcción de equipamiento un socio-cultural en el núcleo urbano del barrio de Santa Cruz en **Artzentales** con más de 12 eventos celebrados durante 2009.
- Proyecto de urbanización general en el Área 21-Mundarro, **Astigarraga** actuando sobre una superficie aproximada de 17.000 m².
- Reurbanización del espacio público en el barrio de Martutene de **Donostia- San Sebastián**, ampliando la extensión de espacios abiertos y de descanso y ocio para los niños en 1.666 m².
- Reurbanización y renovación de las redes de servicios en los barrios de La Cumbre y Elizatxo en **Hernani**, dotándoles a su vez de una urbanización en superficie adecuada al resto del municipio.
- Eliminación de dos edificios en ruinas de **Iurreta** para la creación de zonas comunitarias.
- Recuperación del espacio industrial en ruinas de Dolomitas del Norte en **Karrantza Harana/Valle de Carranza** para su uso comunitario: espacio público, construcción del museo minero, espacios multiusos, salas culturales..
- Urbanización de los barrios obreros de **Legazpi** con más de 71.000 m² de superficie reurbanizada: mejora de accesos, ejecución de aceras, aparcamientos, mejora del alumbrado público y reposición y modificación de mobiliario urbano,..
- Reordenación y reurbanización de los espacios públicos del barrio Ubare en **Villabona** (11.674 m²): modernización de las infraestructuras de saneamiento, acometida de aguas, telefonía y telecomunicaciones, eliminación de barreras arquitectónicas, apertura de nuevo vial, equipamientos urbanos,..
- 9.000 m² de superficie urbanizada y recuperada en la calle San Isidro de **Zeanuri** a favor del peatón, utilizando para ello medidas para moderar el tráfico y reordenar los estacionamientos.

4.2.3. Reducción del impacto ambiental de las actividades urbanas.

Bajo este objetivo **se han alcanzado el 83% de los resultados previstos para todo el periodo por parte de las 60 actuaciones enmarcadas en el mismo.**

Los resultados se han materializado en la renovación de 95.100 m lineales de redes de suministro y saneamiento, la rehabilitación de más de 350 hectáreas de superficie entre la que más de 20 hectáreas corresponden a la habilitación de parques y zonas verdes en el medio urbano.

Gráfico 15: Contribución de los Programas Izartu a la "Reducción del impacto ambiental"

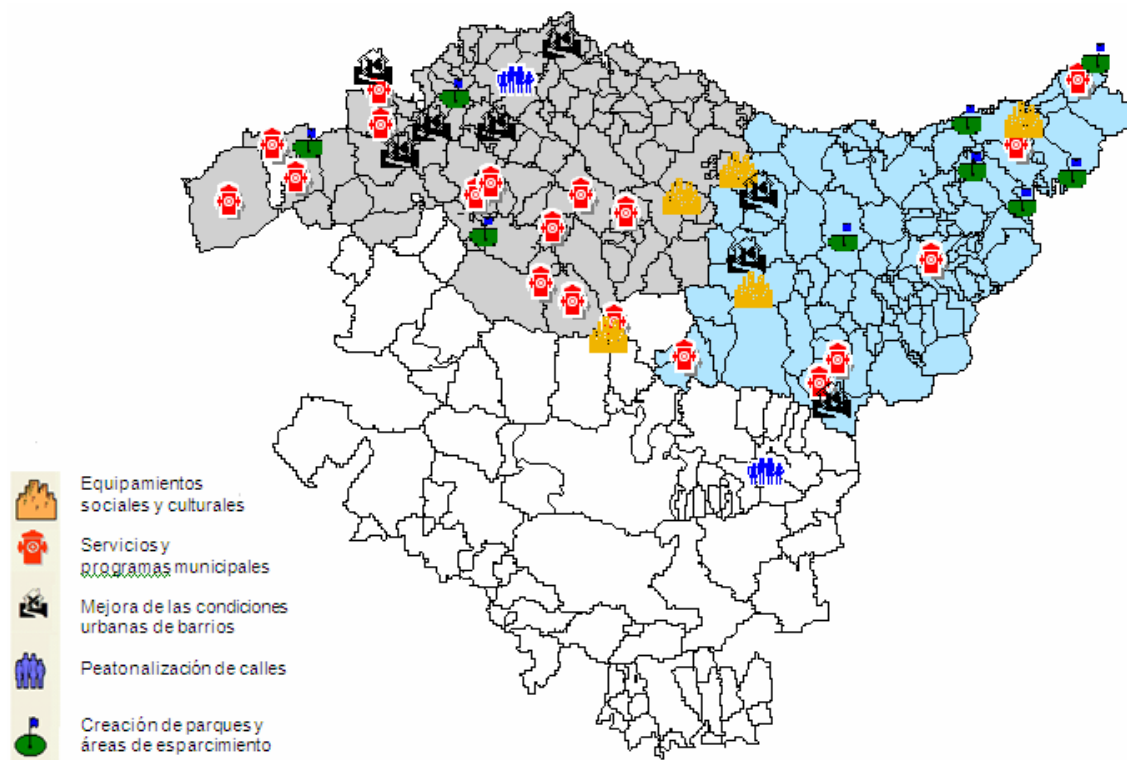

Estas actuaciones **están contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental urbanística de los municipios beneficiarios**, incrementando los espacios públicos y zonas de esparcimiento naturales en el medio urbano e impulsando una mayor eficiencia energética y economía de recursos a través de las reformas en las redes y servicios que posibilitan un mayor ahorro y la reducción de emisiones contaminantes.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES URBANAS


- *Adecuación y mejora Parque Ametzagaina en **Donostia- San Sebastián** con la recuperación de este espacio natural en el entorno urbano de Martutene, creando un área de esparcimiento de parque periurbano con un total de 4,26 hectáreas repobladas.*
- *Modernización del alumbrado público de **Karrantza Harana/Valle de Carranza** bajo los criterios de la eficiencia energética definidos en la agenda local 21 beneficiando a los 2.887 residentes con una nueva instalación eléctrica un 30% más eficiente que la antigua.*
- *Programa de embellecimiento urbano de **Elgoibar** mediante la intervención directa de mejoras en la vía pública: mobiliario urbano, señalización, iluminación, jardinería, etc.*
- *Soterramiento de contenedores de basura y residuos en **Trucios/Turtzioz** y acabado del entorno en 3,4 km2 de superficie.*
- *Soterramiento de sistema general de instalaciones urbanas de **Zeanuri**: 7.500 m de tuberías de servicios mejorados, 3.000 m de cables instalados o sustituidos, 22.500m de superficie beneficiada por la implantación de los nuevos servicios...*

4.2.4. Apoyo al empresariado, PYMES, turismo y patrimonio municipal.

Con la consecución del **69% de los resultados previstos** al comienzo del Programan Izartu **las 20 actuaciones que persiguen promover la actividad empresarial**, han sumado 150.230 m2 de superficie dedicada a este fin, dotando al empresariado de las infraestructuras necesarias así como de otros programas de apoyo a través de 200 iniciativas desarrolladas que favorecen de manera directa al tejido empresarial.

También está siendo notable el impulso del Programa Izartu a través de estas actuaciones a la **potenciación del sector turístico** contribuyendo de manera directa a la recuperación de activos y puntos de interés y a su valorización.

Gráfico 16: Contribución de los Programas Izartu al "Empresariado, PYMEs y turismo"

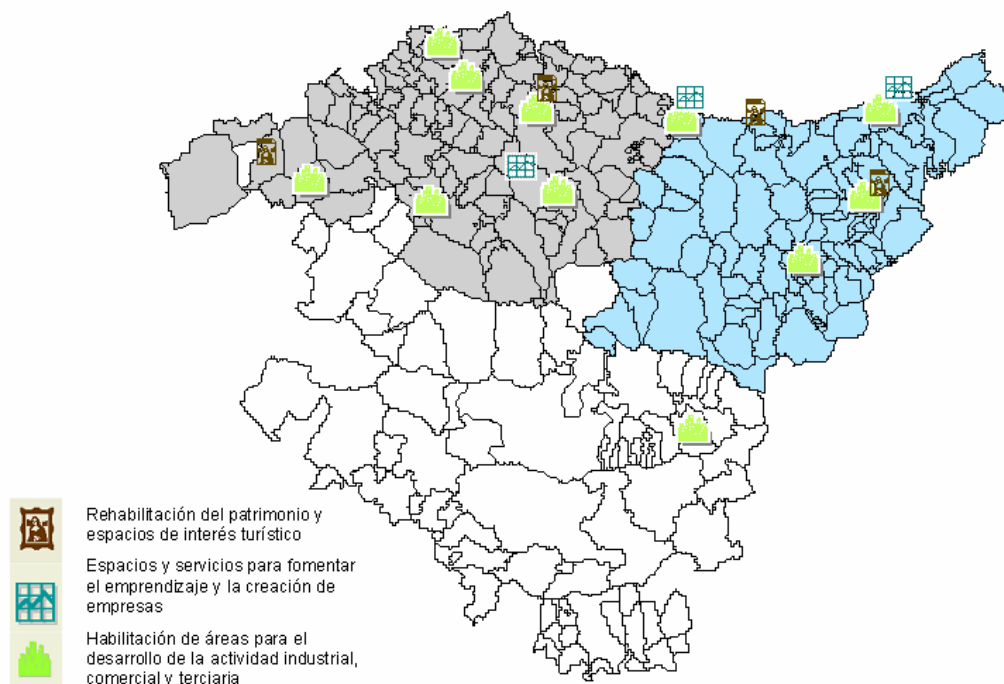

Al igual que en la convocatoria anterior el **Programa Izartu II está contribuyendo de manera notable al desarrollo económico local**. La puesta en marcha de varios programas de apoyo y asesoramiento a la empresa y de formación están capacitando a empresarios y emprendedores en aspectos como la innovación, la mejora de la gestión, la internacionalización,..

Las mejoras urbanísticas están teniendo impactos notables en el pequeño comercio y construcción de bidegorris, paseos y rehabilitación del patrimonio cultural e histórico-arquitectónico están generando nuevas oportunidades para el desarrollo del sector turístico en muchas de las localidades beneficiarias.

APOYO AL EMPRESARIADO, PYMES, TURISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL


- *La revitalización del Polígono de Martutuene de **Donostia- San Sebastián** y su transformación en un espacio para la Nueva Economía ha beneficiado directamente a 400 empresas a través de 50 programas de asesoramiento y mejoras urbanísticas en los accesos, señalización y creación de equipamientos innovadores (Democenter). En la actualidad son más de 10 nuevas empresas las que han sido atraídas al vivero.*
- *La recuperación del frontón JAI ALAI de **Gernika** y su acondicionamiento para otros usos socio-culturales ha propiciado 4.000 m² de superficie que se espera que tenga un gran impacto en la diversificación económica y el fomento del espíritu emprendedor. Asimismo se han dado los primeros pasos para la cubierta del mercado que mejorará notablemente las oportunidades del comercio local.*
- *Creación de una red de bidegorris en **Hernani** de 3.500 m de recorrido en dos nuevos carriles previstos con aproximadamente unos 200 usuarios diarios.*
- *Rehabilitación de las antiguas ikastolas de **Salvatierra/Agurain**, renovando un edificio con un gran valor arquitectónico lo que ha permitido la agrupación de las actividades, hasta ahora dispersas, de la escuela de música.*
- *Creación de un circuito urbano de paseo y ocio en la ladera de Leitoki en **Ugao-Miraballes**, 950 m.*

4.2.5. Introducir nuevas tecnologías de la información y comunicación.

En este objetivo, estrechamente relacionado con la innovación tecnológica, **se enmarcan 6 actuaciones que ya en el año 2009 superan los resultados previstos al inicio del Programa Izartu.**

Así y en los diferentes espacios creados para impulso de las TICs, en el transcurso de estos 6 años se ha instalado 1,6 km de redes de fibra óptica, se han desarrollado programas de introducción a la informática y a las Nuevas Tecnologías y **cuatro iniciativas de administración digital** que cuentan en la actualidad con un elevado porcentaje de usuarios en relación a los habitantes de las localidades beneficiarias y a las que en 2009 se van incorporando nuevos procesos administrativos.

Gráfico 17: Contribución de los Programas Izartu a la "Introducción de las NTICs".ç

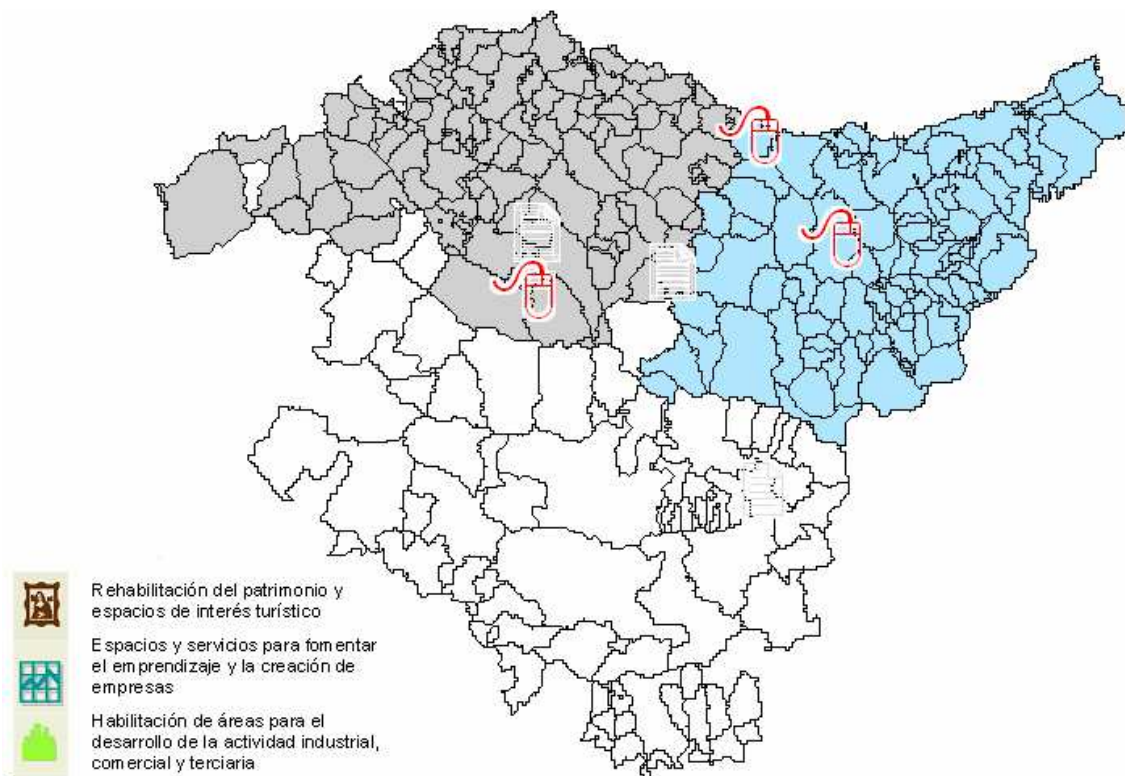

La participación ciudadana en la integración de nuevos servicios informatizados evidencia la gran acogida de los usuarios a los programas de acercamiento a las nuevas tecnologías.

La adquisición de nuevos conocimientos y la interacción entre los usuarios es uno de los principales impactos señalados por los responsables locales. A su vez, la incorporación de las TICs en la gestión de algunos de los trámites administrativos por medio de soluciones informáticas ha propiciado un aumento sustancial en la comodidad y rapidez de las gestiones administrativas, beneficiando a los habitantes de los diferentes municipios que han visto incrementada la accesibilidad ofrecida por los ayuntamientos.

INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES


- *Incorporación del Ayuntamiento de **Azpeitia** a la Sociedad de la Información y al uso de las NTICs por medio de la digitalización de la administración (bases de datos y archivo, GIS, Servicios y trámites a través de la Web municipal,..). Con 9 programas desarrollados (4 más de los previstos) en 2009 se destaca los más de 17.000 usuarios atendidos.*
- *Puesta en marcha de procesos administrativos a través de Internet en el ayuntamiento de **Mutriku** e incremento del número de habitantes que utilizan este acceso.*
- *En **Salvatierra/Agurain** la introducción de la fibra óptica en la localidad y la adecuación del servidor del ayuntamiento con 12 nuevos servicios está contribuyendo a la modernización de las infraestructuras de información y comunicación. El resultado de estos avances se ha traducido en un mejor servicio para los habitantes, que a través de la descentralización de los servicios del ayuntamiento a Zabalarte, la biblioteca y la oficina de turismo entre otros, pueden acceder a los mismos más fácilmente y desde diferentes localizaciones del municipio.*

4.2.6. Discriminación positiva a favor de colectivos amenazados de exclusión social y laboral.

Finalmente, **en este objetivo se han alcanzado un 81% de los resultados previstos**, con 9 de sus 11 actuaciones terminadas: 22.300 m² de superficie dedicada a programas sociales, más de 18.000 nuevos usuarios/as registrados/as, 34 nuevos puestos de trabajo creados y más de 400 actividades sociales y culturales puestas en marcha.

Los impactos obtenidos tras la ejecución de estas actuaciones muestran que el Programa Izartu está **favoreciendo el desarrollo humano y comunitario basado en la igualdad** de oportunidades y en este sentido, consigue incrementar las posibilidades de todos los habitantes, pero con especial atención a los colectivos menos favorecidos. Por otro lado, también se observan impactos muy positivos bajo este objetivo con relación al impulso del sector terciario.

Gráfico 18: Contribución de los Programas Izartu a la "Discriminación positiva"

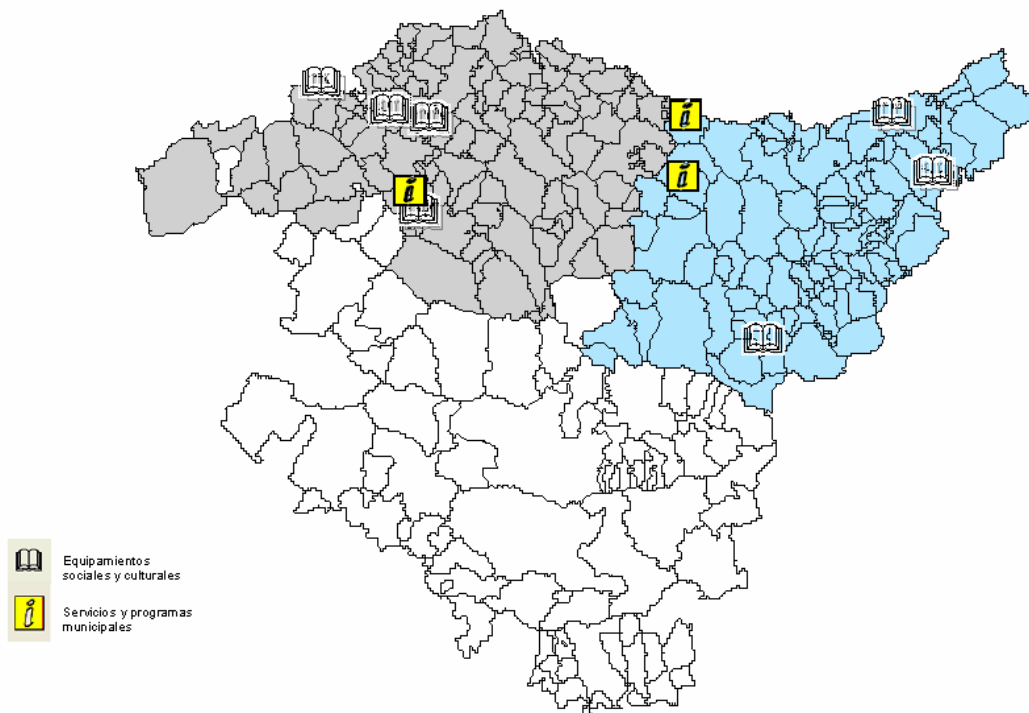

Destaca el incremento de la oferta de servicios culturales y el impulso a la actividad socio-cultural creando nuevos puntos de encuentro entre asociaciones y grupos que favorecen el desarrollo sociocomunitario en las localidades beneficiarias así como nuevas alternativas al ocio infantil y juvenil.

También los responsables locales apuntan como principales efectos a la positiva acogida entre los colectivos más desfavorecidos en aquellos municipios donde se han puesto en marcha nuevos equipamientos y servicios dirigidos a los mismos, destacando especialmente la mejora de sus posibilidades de integración social a través de acciones formativas y de empleo.

**DISCRIMINACIÓN POSITIVA A FAVOR DE COLECTIVOS AMENAZADOS DE EXCLUSIÓN
SOCIAL Y LABORAL**

- *Construcción del caserío Larrabbarri en **Derio** para uso de diversas asociaciones y colectivos que desarrollan actuaciones socio-culturales para la integración social.*
- *Se han incrementado las dotaciones socioculturales del barrio de Martutente en **Donostia-San-Sebastián** con la construcción del centro cívico Etxarri-Ene y el semicierre del patio de la Ikastola. Se trata de un local de 460 m2 que da servicio a 14.000 usuarios dotando al barrio de un lugar de encuentro de juventud con actividades culturales, sociales y recreativas, equipado con los siguientes servicios: salón multiuso y talleres polivalentes, "educadores de calle", Gazteleku y área para las Nuevas Tecnologías.*
- *En **Erandio** se ha construido un nuevo equipamiento de 700 m2 de superficie para el uso asistencial y socio-cultural: consultorio médico con el incremento de un 50% de la capacidad de servicio, centro de reunión de la tercera edad, locales para usos sociales, sala polivalente municipal y guardería.*
- *En **Hernani** se ha ampliado y adecuado la Residencia de ancianos a la normativa prevista para este tipo de equipamientos. Bajo la intervención se ha ampliado una superficie de 3.216 m2 y renovado la existente de 6.727 m2, con lo que la superficie total bajo el nuevo edificio queda en aproximadamente 10.000 m2. Esto permitirá cumplir los estándares de calidad en cuanto al nº de plazas y densidad en la misa.*
- *En **Mutriku** se ha desarrollado un plan de igualdad para la mujer con objeto de potenciar el incremento de su presencia en todos los foros y dirigido también a incrementar sus oportunidades profesionales..*
- *En **Segura** se ha procedido a la rehabilitación total del Hogar del jubilado adecuándolo a las normas de salubridad y accesibilidad: instalación eléctrica, fontanería, accesos, carpintería, mobiliario. Asimismo la obra ha permitido adecuar y habilitar dos zonas para el ocio y las relaciones sociales.*

ANEXO I

Cuadro financiero del

Programa Izartu. 2009

PROGRAMA IZARTU 2004-2008	INVERSIÓN TOTAL	% SUBV.	SUBVENCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	INVERSIÓN POR HABITANTE	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO																				% DE GASTO ACUMULADO SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL	ANO 2010 PLANIFICACIÓN
						ANO 2004			ANO 2005			ANO 2006			ANO 2007			ANO 2008			ANO 2009						
						EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN						
						PLANIFICACIÓN	TOTAL	% SOBRE PLANIFICACIÓN 2004	PLANIFICACIÓN	TOTAL	% SOBRE PLANIFICACIÓN 2005	PLANIFICACIÓN	TOTAL	% SOBRE PLANIFICACIÓN 2006	PLANIFICACIÓN	TOTAL	% SOBRE PLANIFICACIÓN 2007	PLANIFICACIÓN	TOTAL	% SOBRE PLANIFICACIÓN 2008	PLANIFICACIÓN	TOTAL	% SOBRE PLANIFICACIÓN 2009				
TOTAL	172.933.904 €	62%	109.000.000 €	439.471	394 €	1.333.335 €	8.069.433 €	605%	28.145.648 €	28.093.858 €	100%	56.642.343 €	34.885.036 €	62%	55.537.567 €	34.849.291 €	63%	29.970.402 €	29.135.618 €	97%	23.099.976 €	20.876.264 €	90%	90%	12.908.106 €		
ALAVA	5.438.098 €	50%	2.719.050 €	5.751	946 €	33.260 €	46.713 €	140%	866.182 €	876.113 €	101%	1.233.391 €	2.632.697 €	213%	2.136.485 €	109.224 €	5%	586.490 €	423.483 €	72%	1.673.575 €	1.866.378 €	112%	109%	- €		
Llanada Alavesa	5.438.098 €	50%	2.719.050 €	5.751	946 €	33.260 €	46.713 €	140%	866.182 €	876.113 €	101%	1.233.391 €	2.632.697 €	213%	2.136.485 €	109.224 €	5%	586.490 €	423.483 €	72%	1.673.575 €	1.866.378 €	112%	109%	- €		
SALVATIERRA/AGURAIN	2.697.133 €	50%	1.348.567 €	4.006	673 €	16.496 €	46.713 €	283%	429.405 €	496.783 €	116%	352.357 €	362.743 €	103%	1.216.805 €	85.870 €	7%	31.452 €	409.853 €	1303%	1.673.575 €	1.866.378 €	112%	121%	- €		
VITORIA-GASTEIZ	2.740.965 €	50%	1.370.483 €	1.745	1.571 €	16.764 €	- €	- €	436.777 €	379.330 €	87%	881.034 €	2.269.954 €	258%	919.680 €	23.353 €	3%	555.038 €	13.630 €	2%	- €	- €	#DIV/0!	98%	- €		
GIPUZKOA	79.566.533 €	63%	45.910.511 €	178.989	448 €	561.598 €	2.870.360 €	511%	13.282.914 €	11.588.953 €	87%	26.852.634 €	14.865.349 €	55%	26.859.279 €	19.108.073 €	71%	16.296.391 €	15.187.323 €	93%	9.889.094 €	13.089.311 €	135%	96%	5.819.043 €		
Aito Deba	16.064.253 €	35%	5.432.614 €	21.465	748 €	66.454 €	536.612 €	807%	2.843.369 €	2.073.518 €	73%	5.200.025 €	4.162.123 €	80%	4.602.568 €	2.400.675 €	52%	3.682.051 €	3.945.245 €	107%	2.091.909 €	763.405 €	36%	86%	1.257.527 €		
ANTZUOLA	3.899.956 €	30%	1.169.987 €	1.899	2.054 €	14.312 €	28.285 €	198%	880.173 €	323.848 €	37%	1.727.061 €	1.110.688 €	64%	997.479 €	1.137.641 €	114%	1.194.277 €	1.115.725 €	93%	245.378 €	451.931 €	184%	107%	- €		
ARRASATE/MONDRAGON	3.066.685 €	50%	1.533.343 €	2.800	1.095 €	18.756 €	68.406 €	365%	491.563 €	101.593 €	21%	988.610 €	1.697.814 €	172%	1.027.258 €	129.749 €	13%	269.123 €	892.579 €	332%	650.000 €	186.267 €	29%	100%	150.000 €		
BERGARA	4.852.280 €	30%	1.455.684 €	14.965	324 €	17.807 €	388.777 €	2183%	787.603 €	1.117.758 €	142%	843.819 €	793.115 €	94%	1.626.600 €	87.967 €	5%	2.137.343 €	1.911.573 €	89%	256.314 €	42.445 €	17%	89%	71.007 €		
ESKORIATZA	4.245.332 €	30%	1.273.600 €	1.801	2.357 €	15.579 €	51.144 €	328%	684.030 €	530.319 €	78%	1.640.535 €	560.506 €	34%	951.231 €	1.045.318 €	110%	81.308 €	25.368 €	31%	904.217 €	82.763 €	9%	54%	1.036.520 €		
Bajo Bidasoa	4.560.420 €	75%	3.420.515 €	35.322	129 €	41.839 €	16.468 €	39%	1.181.580 €	562.155 €	48%	1.934.677 €	1.276.668 €	66%	2.006.506 €	2.006.506 €	100%	49.736 €	33.035 €	66%	- €	- €	#DIV/0!	85%	631.471 €		
HONDARRIBIA	1.795.041 €	75%	1.346.281 €	1.301	1.380 €	16.468 €	16.468 €	100%	741.072 €	536.163 €	72%	1.037.501 €	1.224.994 €	118%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	99%	- €	
IRUN	2.765.379 €	75%	2.074.034 €	4.206	657 €	25.371 €	- €	0%	440.508 €	25.992 €	6%	897.176 €	51.674 €	6%	2.006.506 €	2.006.506 €	100%	49.736 €	33.035 €	66%	- €	- €	#DIV/0!	77%	631.471 €		
Bajo Deba	9.362.146 €	58%	5.304.113 €	19.375	483 €	64.881 €	101.843 €	157%	1.502.412 €	896.301 €	60%	2.479.743 €	552.944 €	22%	2.895.360 €	1.851.547 €	64%	2.346.998 €	1.810.215 €	77%	2.538.600 €	3.254.003 €	128%	90%	1.073.915 €		
Elgoibar	3.637.165 €	50%	1.818.583 €	10.440	348 €	22.245 €	44.395 €	200%	587.516 €	323.860 €	55%	1.177.026 €	47.999 €	4%	1.90.072 €	365.753 €	192%	1.009.352 €	830.839 €	82%	1.622.057 €	2.590.660 €	160%	116%	223.749 €		
MUTRIKU	3.232.822 €	50%	1.616.411 €	4.775	677 €	19.772 €	55.280 €	280%	519.506 €	442.754 €	85%	495.778 €	137.525 €	28%	1.872.586 €	1.195.246 €	64%	449.628 €	447.531 €	100%	509.384 €	45.042 €	9%	72%	443.006 €		
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS	2.492.159 €	75%	1.869.119 €	4.160	599 €	22.864 €	2.168 €	9%	395.930 €	129.686 €	33%	806.939 €	367.419 €	46%	832.703 €	290.548 €	35%	888.017 €	531.845 €	60%	407.159 €	618.301 €	152%	78%	440.161 €		
Donostialdea / Donostia San Sebastian	2.473.773 €	75%	1.855.330 €	2.115	1.170 €	22.695 €	- €	0%	392.353 €	343.960 €	88%	800.867 €	481.428 €	60%	826.631 €	832.796 €	101%	817.788 €	727.846 €	89%	87.743 €	130.180 €	148%	102%	76.251 €		
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	2.473.773 €	75%	1.855.330 €	2.115	1.170 €	22.695 €	- €	0%	392.353 €	343.960 €	88%	800.867 €	481.428 €	60%	826.631 €	832.796 €	101%	817.788 €	727.846 €	89%	87.743 €	130.180 €	148%	102%	76.251 €		
Cinturon occidental	10.307.646 €	63%	6.224.845 €	52.390	197 €	76.146 €	1.076.510 €	1414%	1.639.801 €	3.813.724 €	233%	2.894.737 €	1.278.985 €	44%	3.105.264 €	1.008.268 €	32%	2.135.982 €	1.893.230 €	89%	727.833 €	5.080.073 €	698%	137%	478.355 €		
ANDOAIN	2.156.467 €	75%	1.617.350 €	13.814	156 €	19.784 €	310.890 €	1571%	76.184 €	1.529.280 €	450%	696.068 €	271.013 €	39%	721.832 €	16.127 €	2%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	99%	- €		
ASTIGARRAGA	2.862.964 €	50%	1.431.482 €	2.634	1.087 €	17.511 €	39.000 €	223%	457.300 €	1.499.540 €	328%	669.737 €	191.444 €	29%	147.833 €	383.078 €	259%	456.703 €	383.239 €	84%	366.663 €	532.462 €	145%	106%	- €		
HERNANI	3.160.997 €	50%	1.580.299 €	18.747	169 €	19.331 €	726.620 €	3759%	507.359 €	523.986 €	103%	842.390 €	795.932 €	94%	1.151.115 €	24.667 €	2%	1.057.764 €	893.060 €	84%	196.332 €	4.544.131 €	2315%	238%	- €		
LARSATE-ORIA	2.127.618 €	75%	1.595.714 €	17.195	124 €	19.520 €	- €	0%	335.188 €	260.918 €	78%	686.542 €	17.596 €	3%	1.084.484 €	584.396 €	54%	621.516 €	616.931 €	99%	164.837 €	3.480 €	2%	70%	478.355 €		
Cinturon Oriental	8.061.855 €	67%	5.120.911 €	14.672	549 €	62.641 €	3.248 €	5%	729.636 €	241.276 €	33%	3.184.701 €	667.644 €	21%	1.530.581 €	1.964.619 €	128%	1.299.352 €	1.975.610 €	152%	1.619.781 €	928.884 €	57%	72%	1.674.559 €		
ERRENTERIA	2.545.015 €	75%	1.908.781 €	11.455	222 €	23.499 €	3.248 €	14%	404.117 €	24.523 €	6%	824.396 €	282.472 €	34%	850.160 €	1.114.172 €	131%	442.992 €	1.120.599 €	253%	- €	- €	#DIV/0!	100%	- €		
LEZO	1.814.917 €	75%	1.361.188 €	1.935	938 €	16.651 €	- €	0%	283.551 €	133.763 €	47%	583.263 €	13.985 €	2%	12.181 €	182.856 €	1501%	625.322 €	637.714 €	102%	- €	41.331 €	#DIV/0!	56%	945.224 €		
OIARTZUN	3.701.923 €	50%	1.850.962 €	1.282	2.888 €	22.641 €	- €	0%	41.968 €	82.991 €	198%	1.777.042 €	371.187 €	21%	668.240 €	667.591 €	100%	231.038 €	217.297 €	94%	1.619.781 €	887.554 €	55%	60%	729.356 €		
Goierri	11.832.398 €	65%	7.467.665 €	10.370	1.141 €	91.348 €	151.110 €	165%	2.295.896 €	1.477.575 €	64%	4.888.023 €	2.926.552 €	60%	4.926.354 €	4.954.358 €	101%	897.821 €	556.962 €	62%	1.479.287 €	1.029.520 €	70%	94%	101.229 €		
ATAUN	1.917.684 €	75%	1.438.263 €	1.514	1.267 €	17.593 €	9.198 €	52%	300.521 €	418.264 €	139%	617.204 €	238.554 €	39%	642.968 €	285.210 €	44%	210.803 €	73.647 €	35%	710.803 €	44.671 €	6%	56%	44.853 €		
LEGAZPI	2.949.969 €	50%	1.474.984 €	4.820	612 €	18.043 €	52.283 €	290%	471.934 €	471.938 €	100%	950.062 €	743.819 €	78%	987.208 €	820.664 €	83%	425.813 €	383.934 €	90%	436.451 €	587.166 €	135%	104%	- €		
SEGURA	2.319.911 €	75%	1.739.934 €	1.225	1.894 €	21.284 €	44.802 €	210%	366.944 €	39.902 €	11%	1.015.429 €	481.931 €	47%	775.814 €	1.330.936 €	172%	1.390.304 €	29.556 €	119%	397.684 €	119.981 €	100%	100%	56.376 €		
ZALDIBA	2.676.563 €	50%	1.338.281 €	1.517	1.764 €	16.371 €	- €	0%	425.948 €	105.899 €	25%	859.762 €	172.360 €	20%	2.328.479 €	172.360 €	100%	69.825 €	69.825 €	100%	- €	- €	#DIV/0!	100%	- €		
ZEGAMA	1.968.271 €	75%	1.476.203 €	1.294	1.521 €	18.057 €	44.827 €	248%	730.549 €	441.572 €	60%	1.445.565 €	1.289.988 €	89%	191.885 €	189.069 €	99%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100%	- €		
Tolosaldea / Tolosa	8.653.296 €	75%	6.489.971 €	12.918	670 €	79.387 €	336.219 €	424%	1.380.504 €	1.054.535 €	76%	2.809.488 €	1.472.608 €	52%	4.202.587 €	2.487.206 €	59%	2.550.096 €	2.374.713 €	93%	755.131 €	1.606.705 €	213%	108%	154.522 €		
IBARRA	2.223.511 €	75%	1.667.633 €	4.208	528 €	20.399 €	324.199 €	1589%	351.025 €	654.917 €	187%	718.211 €	543.702 €	76%	743.975 €	349.302 €	47%	107.619 €	107.619 €	100%	96.885 €	143.992 €	14%	8			
